AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

LISTA DE ASISTENCIA

Comisión de Adjudicación de Obra Pública
SESIÓN ORDINARIA 05/14

PUNTOS 1 y 2

Ing. Ramiro Hernández García Presidente Municipal **Lic. Hugo de León Meza** Presidente de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública	**Lic. Francisco Padilla Villarruel** Tesorero Municipal Suplente: **L.A.E María del Rosario Ruiz Uribe**	**C.P.A. Gustavo Cesar Galindo** Secretario de la Contraloría Suplente: **Arq. Ricardo Flores Villaseñor**	**Lic. Sergio Tabares Orozco** Regidor que Preside la Comisión de Obra Pública Suplente: **C.P. Mario Alberto Salazar Madera**
Lic. Jose Luis Ayala Cornejo Regidor que pres de la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable Suplente: **Alejandro Bueno Perez**	**Mtro. Carlos Alberto Briseño Becerra** Regidor que preside la Comisión de Hacienda Publica Suplente: **Mtro. Cesar Guillermo Ruvalcaba Gómez**	**Dra. Maria Candelaria Ochoa Ávalos** Regidora que preside la Comisión edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Suplente:	**Ing. Jose Luis Moreno Rojas** Secretario de Obras Públicas Suplente: **Ing. Juan Carlos Navarro Ruiz** Director de Construcción
Lic. José Francisco Castillo Madrigal Secretario de Servicios Públicos Municipales Suplente: **Ing. Alberto Arreola Castañeda**	**Arq. Diego Delfin Alvarez del Castillo.** Titular de la Comisión de Planeación Urbana de Guadalajara Suplente: **Arq. Sergio Baeza**	**Ing. Rigoberto Mohtezuma Rizo** Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales Suplente: **Lic. Jaime Fajardo Vázquez**	**Ing. Juan Carlos Navarro Ruiz.** Secretario Técnico de la Comisión Suplente: **Arq. Luis Fernando De alba Perez**
Ing. Alejandro Guevara Castellanos. Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C Suplente: **Ing. Hector Manuel Zepeda Angulo** Ricardo Rizo Soto	**Arq. Luis Reynaldo Galvan Bermejo** Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C Suplente: **Arq. Fausto Rangel Ramirez**	**Ing. Benjamin Cárdenas Chávez** Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Suplente: **Arq. Juan Manuel Deseinmann Arias**	**Ing. Luis Rubén Camberos Othón** Consejo para la Transparencia y la Ética Pública Suplente: **Lic. Rafael Preciado Vargas**

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA **SESIÓN ORDINARIA 05/14** DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA CELEBRADA EL **VIERNES 30 DE MAYO DE 2014** DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 19 FRACCIÓN II, ARTICULO 22 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Duración	Anticipo	Contratista	Importe
		4.1 Concursos por Invitación para Emitir Fallo (CI)					
		DEPENDENCIA 2800 PROGRAMA 7 PROYECTO 9 UNIDAD RESPONSABLE 2801 PARTIDA 6130 CONADE					
1	OPG-CONADE-EQP-CI-C04-028/14	REMODELACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA N° 9 "PLAN DE SAN LUIS". TRABAJOS CONSISTENTES EN GIMNASIO DE BOX, MODULO DE JUEGOS Y APARATOS	SAN IGNACIO No. 2332 ESQ. HDA. GUADALUPE, EN LA COL. SAN VICENTE DE LA ZONA 4 OBLATOS	150 dias	30%	Ropla Ingenieros & Arquitectos S.A. de C.V.	$ 3,199,670.43
2	OPG-CONADE-EQP-CI-C04-029/14	REMODELACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA N° 19 "CADETE VICENTE SUÁREZ". TRABAJOS CONSISTENTES EN PISTA DE BICICROSS, MODULO DE BAÑOS, MODULO DE JUEGOS Y APARATOS EJERCITADORES	AV. DE LA CRUZ No. 1950 ESQ. MESA CENTRAL, EN LA COL. SAN MARCOS DE LA ZONA 4 OBLATOS	150 dias	30%	Constructora Tzaulan, S.A. de C.V.	$ 2,126,501.65
3	OPG-CONADE-EQP-CI-C04-030/14	REMODELACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA N° 04 "FRANCISCO JAVIER MINA". TRABAJOS CONSISTENTES EN CONSTRUCCIÓN DE VESTIDORES, REHABILIRACIÓN DE ALBERCA Y EQUIPO.	PRESA LAUREL No. 137 ESQ. DIONISIO RODRÍGUEZ, EN LA COL. JARDINES DE SAN FRANCISCO DE LA ZONA 6 TETLAN.	150 dias	30%	DESIERTO	$ -
4	OPG-CONADE-EQP-CI-C04-031/14	REMODELACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA N° 7 "HÉROES DE CHAPULTEPEC". TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, ÁREA DE EJERCICIO Y JUEGOS INFANTILES.	NICOLÁS ROMERO No. 1477 ESQ. JAIME NUNÓ, EN LA COL. CHAPULTEPEC COUNTRY DE LA ZONA 1 CENTRO.	150 dias	30%	Ingenieria y Construcciones Anrol. S.A. de C.V.	$ 5,428,220.55
						SUBTOTAL	$ 10,754,392.63

LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA AUTORIZA LA EMISIÓN DEL FALLO DE LAS OBRAS ENLISTADAS, MISMO QUE SERÁ PRESENTADO POR EL SECRETARIO TÉCNICO, Y EN CASO DE DECLARARSE DESIERTO SE ASIGNARÁ DIRECTAMENTE CONFORME AL ART. 42 FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SERA NOTIFICADO A LOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO CITADO.

		DEPENDENCIA 3500 PROGRAMA 7 PROYECTO 8 UNIDAD RESPONSABLE 3501 PARTIDA 6120 CONACULTA					
5	OPG-CONACULTA-EQP-CI-C04-032/14	"REHABILITACIÓN DEL TEATRO TORRES BODET"	AV. ESPAÑA ESQ. CON AV. CHAPULTEPEC SUR, EN LA COL. MODERNA DE LA ZONA 1 CENTRO	150 dias	30%	Ciarco Constructora S.A. de C.V.	$ 2,570,911.16
						SUBTOTAL	$ 2,570,911.16

LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA AUTORIZA LA EMISIÓN DEL FALLO DE LAS OBRAS ENLISTADAS, MISMO QUE SERÁ PRESENTADO POR EL SECRETARIO TÉCNICO, Y EN CASO DE DECLARARSE DESIERTO SE ASIGNARÁ DIRECTAMENTE CONFORME AL ART. 42 FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SERA NOTIFICADO A LOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO CITADO.

Abstención

En contra

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Duración	Anticipo	Contratista	Importe
		4.2 Concursos por Invitación para Emitir Fallo (CI)					
		DEPENDENCIA 2800 PROGRAMA 1 PROYECTO 2 UNIDAD RESPONSABLE 2801 PARTIDA 6130 Desazolves					
6	**OPG-OD-IHS-CI-C04-033/14**	CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCION DEL TEMPORAL DE LLUVIAS EN LA CIUDAD	EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD	150 dias	30%	**Logistica Constructiva S.A. de C.V.**	$ *5,904,202.27*
						SUBTOTAL	$ *5,904,202.27*

LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA AUTORIZA LA EMISIÓN DEL FALLO DE LAS OBRAS ENLISTADAS, MISMO QUE SERÁ PRESENTADO POR EL SECRETARIO TÉCNICO, Y EN CASO DE DECLARARSE DESIERTO SE ASIGNARÁ DIRECTAMENTE CONFORME AL ART. 96 FRACCION VII DEL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE GUADALAJARA Y EL 180 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SERA NOTIFICADO A LOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO CITADO.

NO. DE OBRAS	DE LA CUENTA	
4	DEPENDENCIA 2800 PROGRAMA 7 PROYECTO 9 UNIDAD RESPONSABLE 2801 PARTIDA 6130 CONADE	$ *10,754,392.63*
1	DEPENDENCIA 3500 PROGRAMA 7 PROYECTO 8 UNIDAD RESPONSABLE 3501 PARTIDA 6120 CONACULTA	$ *2,570,911.16*
1	DEPENDENCIA 2800 PROGRAMA 1 PROYECTO 2 UNIDAD RESPONSABLE 2801 PARTIDA 6130 Desazolves	$ *5,904,202.27*
6		$ *19,229,506.06*

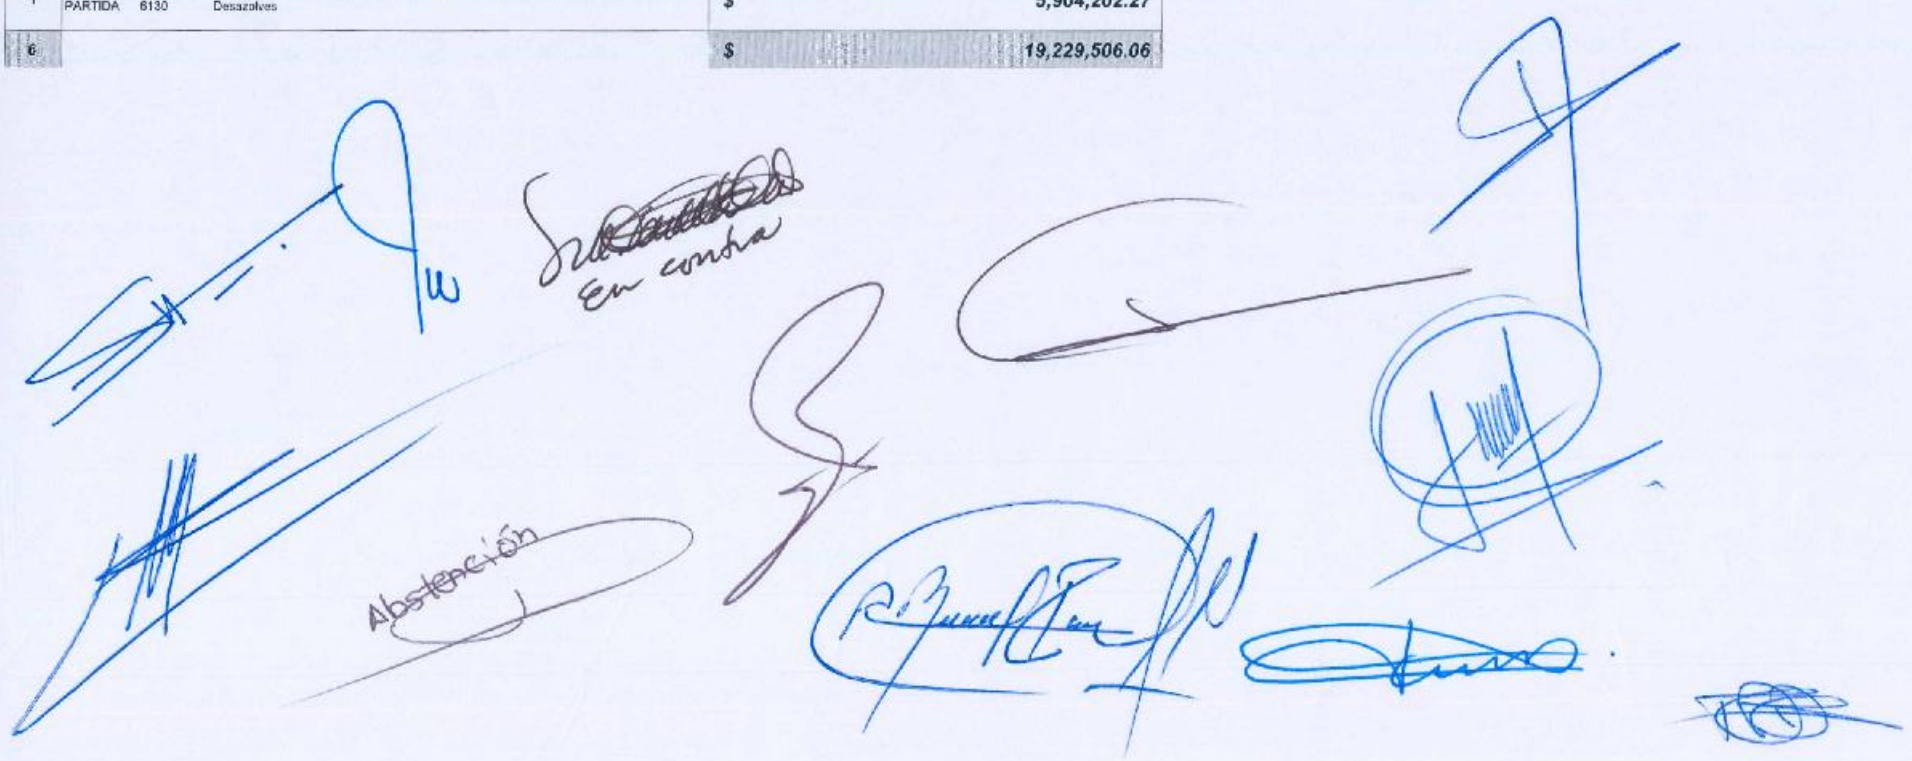

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Duración	Anticipo	Contratista	Importe

Ing. Ramiro Hernández García
Presidente Municipal

Lic. Hugo de León Meza
Presidente de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública:

Lic. Francisco Padilla Villarruel
Tesorero Municipal

Suplente:
L.A.E María del Rosario Ruiz Uribe
Abstención

C.P.A. Gustavo Cesar Galindo
Secretario de la Contraloría

Suplente:
Arq. Ricardo Flores Villaseñor

Lic. Sergio Tabares Orozco
Regidor que Preside la Comisión de Obra Pública

Suplente:

Lic. Jose Luis Ayala Cornejo
Regidor que preside la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable

Suplente:

Mtro. Carlos Alberto Briseño Becerra
Regidor que preside la Comisión de Hacienda Pública

Suplente:
Mtro. Cesar Guillermo Ruvalcaba Gómez

Dra. María Candelaria Ochoa Ávalos
Regidora que preside la Comisión edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción

Suplente:

Ing. Jose Luis Moreno Rojas
Secretario de Obras Públicas

Suplente:
Ing. Juan Carlos Navarro Ruiz
Director de Construcción

Lic. José Francisco Castillo Madrigal
Secretario de Servicios Públicos Municipales

Suplente:
Ing. Alberto Arreola Castañeda

Arq. Diego Delfín Alvarez del Castillo.
Titular de la Comisión de Planeación Urbana de Guadalajara

Suplente:
ARQ. SERGIO H. BAEZA.

Ing. Rigoberto Mohtufar Rizo
Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales

Suplente:
Lic. Jaime Fajardo Vázquez

Ing. Juan Carlos Navarro Ruiz.
Secretario Técnico de la Comisión

Suplente:
Arq. Luis Fernando De alba Perez

Ing. Alejandro Guevara Castellanos.
Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C

Suplente:
Ing. Hector Manuel Zepeda Angulo

Arq. Luis Reynaldo Galvan Bermejo
Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C

Suplente:
Arq. Fausto Rangel Ramirez

Ing. Benjamin Cárdenas Chávez
Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Suplente:
Arq. Juan Manuel Deseinmann Arias

Ing. Luis Rubén Camberos Othón
Consejo para la Transparencia y la Ética Pública

Suplente:
Lic. Rafael Preciado Vargas

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA SESIÓN ORDINARIA 05/14 DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA CELEBRADA EL VIERNES 30 DE MAYO DE 2014 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 19 FRACCIÓN I, ARTICULO 22 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Duración	Anticipo	Contratista	Importe
		5-. Adjudicaciones Directas (AD)					
		DEPENDENCIA 0000 PROGRAMA 0 PROYECTO 00 UNIDAD RESPONSABLE 0000 PARTIDA 0000					
1	OPG-OD-EQP-AD-C05-037/14	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA GUADALAJARA, TRABAJOS CONSISTENTES EN LA IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION DE LA ADMINISTRACIÓN, ADAPTACIÓN DE LOCALES, AREAS COMUNES, CUARTO DE MAQUINAS, DRENAJE Y AIRE ACONDICIONADO.	AV. HIDALGO Y AV. ALCALDE, EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE LA ZONA 1 CENTRO	90 dias	30%	Divicon S.A. de C.V.	$ 2,699,449.68
2	OPG-OD-EQP-AD-C05-038/14	DEMOLICIÓN DEL MERCADO CORONA	AV. HIDALGO ESQ. ZARAGOZA, EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE LA ZONA 1 CENTRO	30 dias	30%	Flota Constructora, S.A. de C.V.	$ 4,825,600.00
3	OPG-OD-EQP-AD-C05-039/14	RETIRO, EMBALAJE Y RESGUARDO DE ELEMENTOS DE CANTERA EN EL MERCADO CORONA	AV. HIDALGO ESQ. ZARAGOZA, EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE LA ZONA 1 CENTRO	30 dias	30%	Ingenieria y Sistemas de Infraestructura S.A. de C.V.	
4	OPG-OD-EQP-AD-C05-040/14	ASESORAMIENTO Y SUPERVISION EXTERNA PARA LAS OBRAS DE DESMONTAJE DE PIEZAS CON VALOR PATRIMONIAL EN EL MERCADO CORONA	AV. HIDALGO ESQ. ZARAGOZA, EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE LA ZONA 1 CENTRO	30 dias	30%	Arq. Liza Nohemi Tapia Garcia	$ 35,530.09
5	OPG-OD-IHS-AD-C05-041/14	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCION DEL TEMPORAL DE LLUVIAS AL NORTE DE LA CIUDAD	EN DIFERENTES COLONIAS AL NORTE DE LA CIUDAD	30 dias	0%	Flota Constructora S.A. de C.V.	$ 1,001,742.99
						SUBTOTAL	$ 8,562,322.76

LAS PRESENTES AUTORIZACIONES SE CONTRATARAN CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 82 FRACCIÓN I INCISO a) DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.

No.	DE LA CUENTA	
5	DEPENDENCIA 0000 PROGRAMA 0 PROYECTO 00 UNIDAD RESPONSABLE 0000 PARTIDA 0000	$ 8,562,322.76
5		$ 8,562,322.76

Abstención

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Duración	Anticipo	Contratista	Importe

5-. Adjudicaciones Directas (AD)

Ing. Ramiro Hernández García
Presidente Municipal

Lic. Hugo de León Meza
Presidente de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública:

Lic. Francisco Padilla Villarruel
Tesorero Municipal

Suplente:
L.A.E María del Rosario Ruiz Uribe

C.P.A. Gustavo Cesar Galindo
Secretario de la Contraloría

Suplente:
Arq. Ricardo Flores Villaseñor

Lic. Sergio Tabares Orozco
Regidor que Preside la Comisión de Obra Pública

Suplente:

Lic. Jose Luis Ayala Cornejo
Regidor que preside la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable

Suplente:

Mtro. Carlos Alberto Briseño Becerra
Regidor que presice la Comisión de Hacienca Publica

Suplente:
Mtro. Cesar Guillermo Ruvalcaba Gómez

Dra. María Candelaria Ochoa Ávalos
Regidora que preside la Comisión edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción

Suplente:

Ing. Jose Luis Moreno Rojas
Secretario de Obras Públicas

Suplente:
Ing. Juan Carlos Navarro Ruiz
Director de Construcción

Lic. José Francisco Castillo Madrigal
Secretario de Servicios Públicos Municipales

Suplente:
Ing. Alberto Arreola Castañeda

Arq. Diego Delfin Alvarez del Castillo.
Titular de la Comisión de Planeación Urbana de Guadalajara

Suplente:

ARQ. SERGIO H. BAEZA

Ing. Rigoberto Montúfar Rizo
Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales

Suplente:
Lic. Jaime Fajardo Vázquez

Ing. Juan Carlos Navarro Ruiz.
Secretario Técnico de la Comisión

Suplente:
Arq. Luis Fernando De alba Perez

Ing. Alejandro Guevara Castellanos.
Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C

Suplente:
Ing. Hector Manuel Zepeda Angulo

Arq. Luis Reynaldo Galvan Bermejo
Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C

Suplente:
Arq. Fausto Rangel Ramirez

Ing. Benjamin Cárdenas Chávez
Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Suplente:
Arq. Juan Manuel Deselnmann Arias

Ing. Luis Rubén Camberos Othón
Consejo para la Transparencia y la Ética Pública

Suplente:
Lic. Rafael Preciado Vargas

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA SESIÓN ORDINARIA 05/14 DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA CELEBRADA EL VIERNES 30 DE MAYO DE 2014 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 19 FRACCIÓN II, ARTICULO 22 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Duración	Anticipo	Contratista	Importe

6.1 Modificaciones

AUTORIZACIÓN ORIGINAL DE SESIÓN 01/14 **DICE:**

DEPENDENCIA 2800 PROGRAMA 1 PROYECTO 12 UNIDAD RESPONSABLE 2801 PARTIDA 6140 Proyectos

1	OPG-OD-EYP-AD-C01-008/14	PROYECTO CONCEPTUAL - URBANO - ARQUITECTONICO PARA EL "CORREDOR AV. MEXICO - COME"	TRAMO COMPRENDIDO ENTRE ANDRES TERAN AL ORIENTE Y LA GLORIETA DE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV. MEXICO AL PONIENTE, EN LA COL. LADRON DE GUEVARA DE LAS ZONAS 1 CENTRO Y 2 MINERVA	30 dias	25%	Arq. Oscar Ladron de Guevara Fregoso	$ 450,080.00

MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN **DEBIENDO DECIR:**

DEPENDENCIA 2800 PROGRAMA 1 PROYECTO 2 UNIDAD RESPONSABLE 2801 PARTIDA 6190 Proyectos Ejecutivos

1	OPG-OD-EYP-AD-C01-008/14	PROYECTO CONCEPTUAL - URBANO - ARQUITECTONICO PARA EL "CORREDOR AV. MEXICO - COME"	TRAMO COMPRENDIDO ENTRE ANDRES TERAN AL ORIENTE Y LA GLORIETA DE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV. MEXICO AL PONIENTE, EN LA COL. LADRON DE GUEVARA DE LAS ZONAS 1 CENTRO Y 2 MINERVA	30 dias	25%	Arq. Oscar Ladron de Guevara Fregoso	$ 450,080.00

AUTORIZACIÓN ORIGINAL DE SESIÓN 01/14 **DICE:**

DEPENDENCIA 2800 PROGRAMA 1 PROYECTO 12 UNIDAD RESPONSABLE 2801 PARTIDA 6140 Proyectos

2	OPG-OD-EYP-AD-C01-009/14	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL NUEVO MERCADO "PEDRO OGAZON"	COMPRENDIDO EN EL POLIGONO DE ANADE, ANDADOR PERDIZ, FRESNO Y ANDADOR TORTULA EN LA COL. MORELOS (TEPOPOTE) DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR.	30 dias	25%	Triada, Consultoria y Servicios S. C.	$ 668,130.60

MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN **DEBIENDO DECIR:**

DEPENDENCIA 2800 PROGRAMA 5 PROYECTO 24 UNIDAD RESPONSABLE 2801 PARTIDA 6160 Obras de Contingencia

2	OPG-OD-EYP-AD-C01-009/14	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL NUEVO MERCADO "PEDRO OGAZON"	COMPRENDIDO EN EL POLIGONO DE ANADE, ANDADOR PERDIZ, FRESNO Y ANDADOR TORTULA EN LA COL. MORELOS (TEPOPOTE) DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR.	30 dias	25%	Triada, Consultoria y Servicios S. C.	$ 668,130.60

6.2 Modificaciones

AUTORIZACIÓN ORIGINAL DE SESIÓN 01/14 — **DICE:**

DEPENDENCIA 2800 PROGRAMA 1 PROYECTO 12 UNIDAD RESPONSABLE 2801 PARTIDA 6140 Contingencias

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Duración	Anticipo	Contratista	Importe
3	OPG-OD-CON-AD-C01-017/14	A) APUNTALAMIENTO (REFORZADO) DE TRABES PARA EVENTO DEL 27/AGO AL 09/SEP DE 2013	EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA PLAZA LIBERACIÓN PRIMER CUADRO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD, DE LA ZONA 1 CENTRO.	27/Ago/2013 al 20/Ene/2014	25%	Constructora TGV S.A. de C.V.	$ 2,417,889.38
		B) APUNTALAMIENTO (REFORZADO) DE TRABES PARA EVENTO DEL 13 AL 16 DE SEP/2013					
		C) APUNTALAMIENTO (LIGERO) DE TRABES PARA EVENTO DEL 16 AL 17 DE SEP/2013					
		D) APUNTALAMIENTO (LIGERO) DE TRABES PARA EVENTO DEL 18 AL 20 DE SEP/2013					
		E) APUNTALAMIENTO (LIGERO) DE TRABES PARA EVENTO DEL 20 AL 23 DE SEP/2013					
		F) APUNTALAMIENTO (LIGERO) DE TRABES PARA EVENTO DEL 23/SEP AL 08/NOV DE 2013					
		G) APUNTALAMIENTO (REFORZADO) DE TRABES PARA EVENTO DEL 08/NOV AL 11/NOV DE 2013					
		H) APUNTALAMIENTO (REFORZADO) DE TRABES PARA EVENTO DEL 15 AL 19 DE NOV/2013					
		I) APUNTALAMIENTO (LIGERO) DE TRABES PARA EVENTO DEL 22 AL 25 DE NOV/2013					
		J) APUNTALAMIENTO (REFORZADO) DE TRABES PARA EVENTO DEL 28/NOV/2013 AL 20/ENE/2014					
		K) APUNTALAMIENTO (LIGERO) DE TRABES PARA EVENTO DEL 27 AL 30 SEP/2013	EN LA EXPLANADA DEL HOSPICIO CABAÑAS PRIMER CUADRO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD, DE LA ZONA 1 CENTRO				
		L) APUNTALAMIENTO (LIGERO) DE TRABES PARA EVENTO DEL 07 AL 08 OCT/2013					
		M) APUNTALAMIENTO (REFORZADO) DE TRABES PARA EVENTO DEL 10 AL 11 OCT/2013					
		N) APUNTALAMIENTO (LIGERO) DE TRABES PARA EVENTO DEL 25 AL 28 OCT/2013					
		O) APUNTALAMIENTO (LIGERO) DE TRABES PARA EVENTO DEL 28 AL 30 OCT/2013					
		P) APUNTALAMIENTO (LIGERO) DE TRABES PARA EVENTO DEL 08 AL 11 NOV/2013					
		Q) APUNTALAMIENTO (LIGERO) DE TRABES PARA EVENTO DEL 15 AL 19 NOV/2013					
		R) APUNTALAMIENTO (REFORZADO) DE TRABES PARA EVENTO DEL 21 AL 25 NOV/2013					
		S) APUNTALAMIENTO (REFORZADO) DE TRABES PARA EVENTO DEL 28/NOV/2013 AL 20/ENE/2014					

MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN — **DEBIENDO DECIR:**

DEPENDENCIA 2800 PROGRAMA 5 PROYECTO 24 UNIDAD RESPONSABLE 2801 PARTIDA 6160 Obras de Contingencia

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Duración	Anticipo	Contratista	Importe
3	OPG-OD-CON-AD-C01-017/14	A) APUNTALAMIENTO (REFORZADO) DE TRABES PARA EVENTO DEL 27/AGO AL 09/SEP DE 2013	EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA PLAZA LIBERACIÓN PRIMER CUADRO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD, DE LA ZONA 1 CENTRO.	27/Ago/2013 al 20/Ene/2014	25%	Constructora TGV S.A. de C.V.	$ 2,417,889.38
		B) APUNTALAMIENTO (REFORZADO) DE TRABES PARA EVENTO DEL 13 AL 16 DE SEP/2013					
		C) APUNTALAMIENTO (LIGERO) DE TRABES PARA EVENTO DEL 16 AL 17 DE SEP/2013					
		D) APUNTALAMIENTO (LIGERO) DE TRABES PARA EVENTO DEL 18 AL 20 DE SEP/2013					
		E) APUNTALAMIENTO (LIGERO) DE TRABES PARA EVENTO DEL 20 AL 23 DE SEP/2013					
		F) APUNTALAMIENTO (LIGERO) DE TRABES PARA EVENTO DEL 23/SEP AL 08/NOV DE 2013					
		G) APUNTALAMIENTO (REFORZADO) DE TRABES PARA EVENTO DEL 08/NOV AL 11/NOV DE 2013					
		H) APUNTALAMIENTO (REFORZADO) DE TRABES PARA EVENTO DEL 15 AL 19 DE NOV/2013					
		I) APUNTALAMIENTO (LIGERO) DE TRABES PARA EVENTO DEL 22 AL 25 DE NOV/2013					
		J) APUNTALAMIENTO (REFORZADO) DE TRABES PARA EVENTO DEL 28/NOV/2013 AL 20/ENE/2014					
		K) APUNTALAMIENTO (LIGERO) DE TRABES PARA EVENTO DEL 27 AL 30 SEP/2013	EN LA EXPLANADA DEL HOSPICIO CABAÑAS PRIMER CUADRO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD, DE LA ZONA 1 CENTRO				
		L) APUNTALAMIENTO (LIGERO) DE TRABES PARA EVENTO DEL 07 AL 08 OCT/2013					
		M) APUNTALAMIENTO (REFORZADO) DE TRABES PARA EVENTO DEL 10 AL 11 OCT/2013					
		N) APUNTALAMIENTO (LIGERO) DE TRABES PARA EVENTO DEL 25 AL 28 OCT/2013					
		O) APUNTALAMIENTO (LIGERO) DE TRABES PARA EVENTO DEL 28 AL 30 OCT/2013					
		P) APUNTALAMIENTO (LIGERO) DE TRABES PARA EVENTO DEL 08 AL 11 NOV/2013					
		Q) APUNTALAMIENTO (LIGERO) DE TRABES PARA EVENTO DEL 15 AL 19 NOV/2013					
		R) APUNTALAMIENTO (REFORZADO) DE TRABES PARA EVENTO DEL 21 AL 25 NOV/2013					
		S) APUNTALAMIENTO (REFORZADO) DE TRABES PARA EVENTO DEL 28/NOV/2013 AL 20/ENE/2014					

abstención

6.3 Modificaciones

AUTORIZACIÓN ORIGINAL DE SESIÓN 04/14 — **DICE:**

DEPENDENCIA 0000 PROGRAMA 0 PROYECTO 00 UNIDAD RESPONSABLE 0000 PARTIDA 0000

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Duración	Anticipo	Contratista	Importe
4	OPG-OD-IHS-AD-C04-022/14	A) SANEAMIENTO DEL CANAL DEL SUR (DESAZOLVE)	A) LUIS COVARRUBIAS ENTRE DAVID BERNAGA A 3 DE MAYO, EN LA COL. BALCONES DEL 4 EN LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR	30 días	30%	Terracerías y Pavimentos G&A, S.A. de C.V.	$ 2,451,836.36
		B) SANEAMIENTO DE CANAL PLUVIAL NUEVA ESPAÑA (DESAZOLVE)	B) PROL. AV. COLON ENTRE FRANCISCO OSORNIO Y SECOYA, DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR				
5	OPG-OD-IHS-AD-C04-023/14	A) SANEAMIENTO DEL CANAL PLUVIAL MIRAVALLE (DESAZOLVE)	A) LUIS COVARRUBIAS ENTRE ARTES PLASTICAS Y 3 DE MAYO, EN LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR	30 días	30%	Consorcio Constructor Diestro S.A. de C.V.	$ 1,690,658.74
		B) SANEAMIENTO DEL CANAL HIGUERILLAS (DESAZOLVE)	B) CALZ. LAZARO CARDENAS Y RAMAL DEL FERROCARRIL, EN EL PARQUE LIBERACION DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR				
		C) SANEAMIENTO DEL VASO REGULADOR BALCONES DEL 4 (DESAZOLVE)	C) AV. JESUS REYES HEROLES Y RAFAEL MOLINA, EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR				
6	OPG-OD-IHS-AD-C04-024/14	A) SANEAMIENTO DEL VASO REGULADOR VALENTIN GOMEZ FARIAS (DESAZOLVE)	A) AV. JESUS REYES HEROLES Y MARIA C. BANCALARI, EN LA COL. LOMA LINDA DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR	30 días	30%	Edificaciones Miller, S.R.L. de C.V.	$ 1,669,209.33
		B) SANEAMIENTO VASO REGULADOR 5 DE MAYO (DESAZOLVE)	B) AV. PATRIA Y JOSE MARIA MENDEZ OLIVARES Y DOMINGO LOEZA, EN LA COL. 5 DE MAYO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR				
7	OPG-OD-IHS-AD-C04-025/14	A) SANEAMIENTO DEL CANAL CIENEGA DE MATA 1	A) CIENEGA DE MATA ENTRE HACIENDA DE TALA Y HACIENDA LA CALERA, EN LA COL. HELIODORO HERNANDEZ LOZA DE LA ZONA 4 OBLATOS	30 días	30%	Constructora Cova y Asociados S de R L de C.V.	$ 1,490,857.10
		B) SANEAMIENTO Y DESAZOLVE DEL CANAL LUIS LARA	B) CANAL LUIS LARA ENTRE CELERINO NAVARRO A IGNACIO MEJIA, EN LA COL. LOMAS DEL PARAISO DE LA ZONA 3 HUENTITAN				
		C) SANEAMIENTO Y DESAZOLVE DEL CANAL FOVISSSTE ESTADIO	C) AV. PATRIA ENTRE MONTE SAN ELIAS A CALZADA INDEPENDENCIA, EN LA COL. FOVISSSTE ESTADIO DE LA ZONA 3 HUENTITAN				
8	OPG-OD-IHS-CI-C04-033/14	CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCION DEL TEMPORAL DE LLUVIAS EN LA CIUDAD	EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD	150 días	30%	CONCURSO POR INVITACION	

MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN — **DEBIENDO DECIR:**

DEPENDENCIA 2800 PROGRAMA 1 PROYECTO 2 UNIDAD RESPONSABLE 2801 PARTIDA 6130 Desazolves

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Duración	Anticipo	Contratista	Importe
4	OPG-OD-IHS-AD-C04-022/14	A) SANEAMIENTO DEL CANAL DEL SUR (DESAZOLVE)	A) LUIS COVARRUBIAS ENTRE DAVID BERNAGA A 3 DE MAYO, EN LA COL. BALCONES DEL 4 EN LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR	30 días	30%	Terracerías y Pavimentos G&A, S.A. de C.V.	$ 2,451,836.36
		B) SANEAMIENTO DE CANAL PLUVIAL NUEVA ESPAÑA (DESAZOLVE) **E INSTALACION DE REJILLA EN EL CANAL PLUVIAL ARBOLEDAS DEL SUR.**	B) PROL. AV. COLON ENTRE FRANCISCO OSORNIO Y SECOYA, DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR **Y AV. JACARANDA CRUCE CON ACACIA, EN LA COL. ARBOLEDAS DEL SUR**				
5	OPG-OD-IHS-AD-C04-023/14	A) SANEAMIENTO DEL CANAL PLUVIAL MIRAVALLE (DESAZOLVE)	A) LUIS COVARRUBIAS ENTRE ARTES PLASTICAS Y 3 DE MAYO, EN LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR	30 días	30%	Consorcio Constructor Diestro S.A. de C.V.	$ 1,690,658.74
		B) SANEAMIENTO DEL CANAL HIGUERILLAS (DESAZOLVE)	B) CALZ. LAZARO CARDENAS Y RAMAL DEL FERROCARRIL, EN EL PARQUE LIBERACION DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR				
		C) SANEAMIENTO DEL VASO REGULADOR BALCONES DEL 4 (DESAZOLVE)	C) AV. JESUS REYES HEROLES Y RAFAEL MOLINA, EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR				
6	OPG-OD-IHS-AD-C04-024/14	A) SANEAMIENTO DEL VASO REGULADOR VALENTIN GOMEZ FARIAS (DESAZOLVE)	A) AV. JESUS REYES HEROLES Y MARIA C. BANCALARI, EN LA COL. LOMA LINDA DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR	30 días	30%	Edificaciones Miller, S.R.L. de C.V.	$ 1,669,209.33
		B) SANEAMIENTO VASO REGULADOR 5 DE MAYO (DESAZOLVE)	B) AV. PATRIA Y JOSE MARIA MENDEZ OLIVARES Y DOMINGO LOEZA, EN LA COL. 5 DE MAYO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR				
7	OPG-OD-IHS-AD-C04-025/14	A) SANEAMIENTO DEL CANAL CIENEGA DE MATA 1	A) CIENEGA DE MATA ENTRE HACIENDA DE TALA Y HACIENDA LA CALERA, EN LA COL. HELIODORO HERNANDEZ LOZA DE LA ZONA 4 OBLATOS	30 días	30%	Constructora Cova y Asociados S de R L de C.V.	$ 1,490,857.10
		B) SANEAMIENTO Y DESAZOLVE DEL CANAL LUIS LARA	B) CANAL LUIS LARA ENTRE CELERINO NAVARRO A IGNACIO MEJIA, EN LA COL. LOMAS DEL PARAISO DE LA ZONA 3 HUENTITAN				
		C) SANEAMIENTO Y DESAZOLVE DEL CANAL FOVISSSTE ESTADIO	C) **CANAL DE AV. NORMALISTAS** A CALZADA INDEPENDENCIA, EN LA COL. FOVISSSTE ESTADIO DE LA ZONA 3 HUENTITAN				
8	OPG-OD-IHS-CI-C04-033/14	CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCION DEL TEMPORAL DE LLUVIAS EN LA CIUDAD	EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD	150 días	30%	CONCURSO POR INVITACION	

Abstención

Abstención

6 .4 Modificaciones

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Duración	Anticipo	Contratista	Importe
AUTORIZACIÓN EN LA SESIÓN 04/14		**DICE:**					
		DEPENDENCIA 0000 PROGRAMA 0 PROYECTO 00 UNIDAD RESPONSABLE 0000 PARTIDA 0000					
9	OPG-CONACULTA-EQP-CI-C04-026/14	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL MUSEO PANTEÓN DE BELÉN	CALLE BELÉN 684, ENTRE HOSPITAL Y JESÚS GARCÍA, EN LA COL. ALCALDE BARRANQUITAS DE LA ZONA 1 CENTRO	60 días	30%	Grupo Constructor Contemporaneo S.A. de C.V.	$ 1,007,500.00
10	OPG-CONACULTA-EQP-CI-C04-027/14	"RESTAURACIÓN DE LA CASA REFORMA"	REFORMA NÚMEROS 363, 367, 369 Y 373, EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA ZONA 1 CENTRO	150 días	30%	Napreco Grupo Constructor S.A. de C.V.	$ 4,000,000.00
11	OPG-CONACULTA-EQP-CI-C04-032/14	"REHABILITACIÓN DEL TEATRO TORRES BODET"	AV. ESPAÑA ESQ. CON AV. CHAPULTEPEC SUR, EN LA COL. MODERNA DE LA ZONA 1 CENTRO	150 días	30%	CONCURSO POR INVITACION	
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN		**DEBIENDO DECIR:**					
		DEPENDENCIA 3500 PROGRAMA 7 PROYECTO 8 UNIDAD RESPONSABLE 3501 PARTIDA 6120 CONACULTA					
9	OPG-CONACULTA-EQP-**AD**-C04-026/14	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL MUSEO PANTEÓN DE BELÉN	CALLE BELÉN 684, ENTRE HOSPITAL Y JESÚS GARCÍA, EN LA COL. ALCALDE BARRANQUITAS DE LA ZONA 1 CENTRO	60 días	30%	Grupo Constructor Contemporaneo S.A. de C.V.	$ 1,007,500.00
10	OPG-CONACULTA-EQP-**AD**-C04-027/14	"RESTAURACIÓN DE LA CASA REFORMA"	REFORMA NÚMEROS 363, 367, 369 Y 373, EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA ZONA 1 CENTRO	150 días	30%	Napreco Grupo Constructor S.A. de C.V.	$ 4,000,000.00
11	OPG-CONACULTA-EQP-CI-C04-032/14	"REHABILITACIÓN DEL TEATRO TORRES BODET"	AV. ESPAÑA ESQ. CON AV. CHAPULTEPEC SUR, EN LA COL. MODERNA DE LA ZONA 1 CENTRO	150 días	30%	CONCURSO POR INVITACION	
AUTORIZACIÓN EN LA SESIÓN 04/14		**DICE:**					
		DEPENDENCIA 0000 PROGRAMA 0 PROYECTO 00 UNIDAD RESPONSABLE 0000 PARTIDA 6120					
12	OPG-CONADE-EQP-CI-C04-028/14	REMODELACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Nº 9 "PLAN DE SAN LUIS". TRABAJOS CONSISTENTES EN GIMNASIO DE BOX, MODULO DE JUEGOS Y APARATOS	SAN IGNACIO No. 2332 ESQ. HDA. GUADALUPE, EN LA COL. SAN VICENTE DE LA ZONA 4 OBLATOS	150 días	30%	CONCURSO POR INVITACION	
13	OPG-CONADE-EQP-CI-C04-029/14	REMODELACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Nº 19 "CADETE VICENTE SUÁREZ". TRABAJOS CONSISTENTES EN PISTA DE BICICROSS, MODULO DE BAÑOS, MODULO DE JUEGOS Y APARATOS EJERCITADORES	AV. DE LA CRUZ No. 1950 ESQ. MESA CENTRAL, EN LA COL. SAN MARCOS DE LA ZONA 4 OBLATOS	150 días	30%	CONCURSO POR INVITACION	
14	OPG-CONADE-EQP-CI-C04-030/14	REMODELACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Nº 04 "FRANCISCO JAVIER MINA". TRABAJOS CONSISTENTES EN	PRESA LAUREL No. 137 ESQ. DIONISIO RODRÍGUEZ, EN LA COL. JARDINES DE SAN FRANCISCO DE LA ZONA 6 TETLAN.	150 días	30%	CONCURSO POR INVITACION	
15	OPG-CONADE-EQP-CI-C04-031/14	REMODELACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Nº 7 "HÉROES DE CHAPULTEPEC". TRABAJOS CONSISTENTES EN	NICOLÁS ROMERO No. 1477 ESQ. JAIME NUNÓ, EN LA COL. CHAPULTEPEC COUNTRY DE LA ZONA 1 CENTRO.	150 días	30%	CONCURSO POR INVITACION	
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN		**DEBIENDO DECIR:**					
		DEPENDENCIA 2800 PROGRAMA 7 PROYECTO 9 UNIDAD RESPONSABLE 2801 PARTIDA 6120 CONADE					
12	OPG-CONADE-EQP-CI-C04-028/14	REMODELACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Nº 9 "PLAN DE SAN LUIS". TRABAJOS CONSISTENTES EN GIMNASIO DE BOX, MODULO DE JUEGOS Y APARATOS	SAN IGNACIO No. 2332 ESQ. HDA. GUADALUPE, EN LA COL. SAN VICENTE DE LA ZONA 4 OBLATOS	150 días	30%	CONCURSO POR INVITACION	
13	OPG-CONADE-EQP-CI-C04-029/14	REMODELACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Nº 19 "CADETE VICENTE SUÁREZ". TRABAJOS CONSISTENTES EN PISTA DE BICICROSS, MODULO DE BAÑOS, MODULO DE JUEGOS Y APARATOS EJERCITADORES	AV. DE LA CRUZ No. 1950 ESQ. MESA CENTRAL, EN LA COL. SAN MARCOS DE LA ZONA 4 OBLATOS	150 días	30%	CONCURSO POR INVITACION	
14	OPG-CONADE-EQP-CI-C04-030/14	REMODELACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Nº 04 "FRANCISCO JAVIER MINA". TRABAJOS CONSISTENTES EN **CONSTRUCCIÓN DE VESTIDORES, REHABILIRACIÓN DE ALBERCA Y EQUIPO.**	PRESA LAUREL No. 137 ESQ. DIONISIO RODRÍGUEZ, EN LA COL. JARDINES DE SAN FRANCISCO DE LA ZONA 6 TETLAN.	150 días	30%	CONCURSO POR INVITACION	
15	OPG-CONADE-EQP-CI-C04-031/14	REMODELACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Nº 7 "HÉROES DE CHAPULTEPEC". TRABAJOS CONSISTENTES EN **LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, ÁREA DE EJERCICIO Y JUEGOS INFANTILES.**	NICOLÁS ROMERO No. 1477 ESQ. JAIME NUNÓ, EN LA COL. CHAPULTEPEC COUNTRY DE LA ZONA 1 CENTRO.	150 días	30%	CONCURSO POR INVITACION	

Abstención

No	No. Contrato	Obra	Ubicación	Duración	Anticipo	Contratista	Importe

6 .5 Modificaciones

AUTORIZACIÓN EN LA SESIÓN 04/14 **DICE:**

DEPENDENCIA 2800 PROGRAMA 1 PROYECTO 12 UNIDAD RESPONSABLE 2801 PARTIDA 6140

16	OPG-CZM-PAV-LP-C04-034/14	PRIMERA ETAPA DE RENOVACIÓN DEL PARQUE REVOLUCIÓN	CALZADA DEL FEDERALISMO NORTE ENTRE LÓPEZ COTILLA Y PEDRO MORENO, COL. AMERICANA, DE LA ZONA 1 CENTRO	150 días	30%	LICITACIÓN PUBLICA	
17	OPG-CZM-PAV-LP-C04-035/14	PRIMERA ETAPA DE RENOVACIÓN URBANA DEL CANAL DEL SUR	LUIS COVARRUBIAS, ENTRE AV. 8 DE JULIO Y 03 DE MAYO, ZONA 7 CRUZ DEL SUR	150 días	30%	LICITACIÓN PUBLICA	
18	OPG-CZM-PAV-LP-C04-036/14	PRIMERA ETAPA DE RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE ANALCO	COMPRENDIDO EN EL POLÍGONO ENTRE LA AVENIDA REVOLUCIÓN Y LAS CALLES NICOLÁS BRAVO, BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y 20 DE NOVIEMBRE, DE LA ZONA 1 CENTRO	150 días	30%	LICITACIÓN PUBLICA	

MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN **DEBIENDO DECIR:**

DEPENDENCIA 2800 PROGRAMA 1 PROYECTO 2 UNIDAD RESPONSABLE 2801 PARTIDA 6190 Barrios Tradicionales CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA

16	OPG-CZM-PAV-LP-C04-034/14	PRIMERA ETAPA DE RENOVACIÓN DEL PARQUE REVOLUCIÓN	CALZADA DEL FEDERALISMO NORTE, ENTRE LÓPEZ COTILLA Y PEDRO MORENO, COL. AMERICANA, DE LA ZONA 1 CENTRO	150 días	30%	LICITACIÓN PUBLICA	
17	OPG-CZM-PAV-LP-C04-035/14	PRIMERA ETAPA DE RENOVACIÓN URBANA DEL CANAL DEL SUR	LUIS COVARRUBIAS, ENTRE AV. 8 DE JULIO Y 03 DE MAYO, ZONA 7 CRUZ DEL SUR	150 días	30%	LICITACIÓN PUBLICA	
18	OPG-CZM-PAV-LP-C04-036/14	PRIMERA ETAPA DE RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE ANALCO	COMPRENDIDO EN EL POLÍGONO ENTRE LA AVENIDA REVOLUCIÓN Y LAS CALLES NICOLÁS BRAVO, BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y 20 DE NOVIEMBRE, DE LA ZONA 1 CENTRO	150 días	30%	LICITACIÓN PUBLICA	

*** NOTA: CADA CONCEPTO SOMBREADO ES EL CAMBIO REALIZADO**

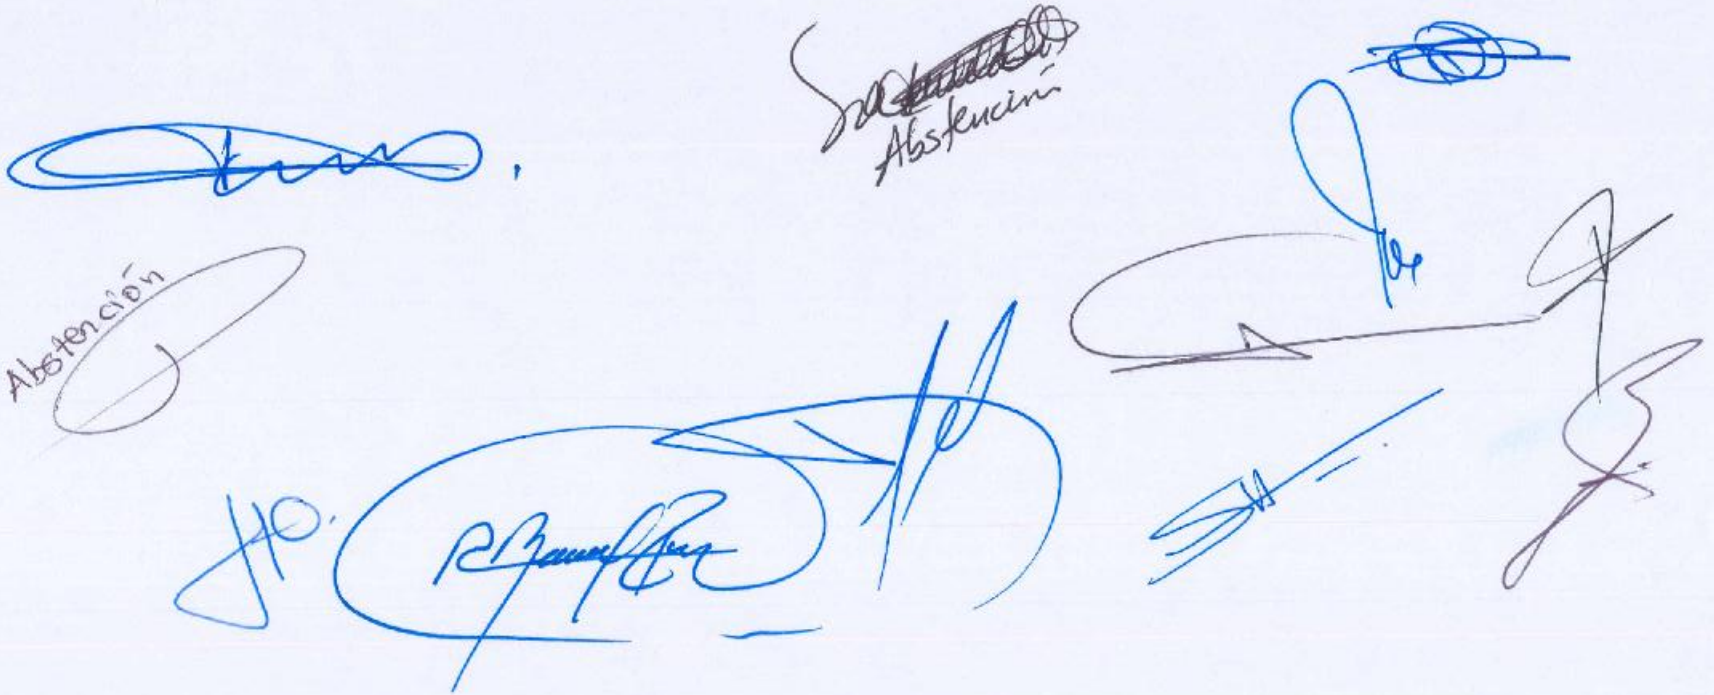

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Duración	Anticipo	Contratista	Importe

Ing. Ramiro Hernández García
Presidente Municipal

Lic. Hugo de León Meza
Presidente de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública:

Lic. Francisco Padilla Villarruel
Tesorero Municipal

abstención

Suplente:
L.A.E María del Rosario Ruiz Uribe

C.P.A. Gustavo Cesar Galindo
Secretario de la Contraloría

Suplente:
Arq. Ricardo Flores Villaseñor

Lic. Sergio Tabares Orozco
Regidor que Preside la Comisión de Obra Pública

Suplente:

Lic. Jose Luis Ayala Cornejo
Regidor que preside la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable

Suplente:

Mtro. Carlos Alberto Briseño Becerra
Regidor que preside la Comisión de Hacienda Publica

Suplente:
Mtro. Cesar Guillermo Ruvalcaba Gómez

Dra. María Candelaria Ochoa Ávalos
Regidora que preside la Comisión edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción

Suplente:

Ing. Jose Luis Moreno Rojas
Secretario de Obras Públicas

Suplente:
Ing. Juan Carlos Navarro Ruiz
Director de Construcción

Lic. José Francisco Castillo Madrigal
Secretario de Servicios Públicos Municipales

Suplente:
Ing. Alberto Arreola Castañeda

Arq. Diego Delfín Alvarez del Castillo.
Titular de la Comisión de Planeación Urbana de Guadalajara

Suplente:

Arq. Sergio H. Baeza

Ing. Rigoberto Montufar Rizo
Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales

Suplente:
Lic. Jaime Fajardo Vázquez

Ing. Juan Carlos Navarro Ruiz.
Secretario Técnico de la Comisión

Suplente:
Arq. Luis Fernando De alba Perez

Ing. Alejandro Guevara Castellanos.
Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C

Suplente:
Ing. Hector Manuel Zepeda Angulo

Ricardo Ruiz Sosa

Arq. Luis Reynaldo Galvan Bermejo
Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C

Suplente:
Arq. Fausto Rangel Ramirez

Ing. Benjamin Cárdenas Chávez
Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Suplente:
Arq. Juan Manuel Deseinmann Arias

Ing. Luis Rubén Camberos Othón
Consejo para la Transparencia y la Ética Pública

Suplente:
Lic. Rafael Preciado Vargas

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA SESIÓN ORDINARIA 05/14 DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA CELEBRADA EL VIERNES 30 DE MAYO DE 2014 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 19 FRACCIÓN II, ARTICULO 22 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Duración	Anticipo	Contratista	Importe

7. Cancelación

OBRAS CANCELADAS:

DEPENDENCIA 2800 PROGRAMA 1 PROYECTO 12 UNIDAD RESPONSABLE 2801 PARTIDA 6140

1	OPG-OD-EQP-LP-C01-018/14	CONSTRUCCION DEL NUEVO MERCADO "PEDRO OGAZÓN"	COMPRENDIDO EN EL POLIGONO DE ANADE, ANDADOR PERDIZ, FRESNO Y ANDADOR TORTULA, EN LA COL. MORELOS (TEPOPOTE) DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR.	dias		LICITACIÓN PUBLICA	

MONTO TOTAL DE LAS OBRAS CANCELADAS $ -

* NOTA: CADA CONCEPTO SOMBREADO ES EL CAMBIO REALIZADO

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Duración	Anticipo	Contratista	Importe

Ing. Ramiro Hernández García
Presidente Municipal

Lic. Hugo de León Meza
Presidente de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública:

Lic. Francisco Padilla Villarruel
Tesorero Municipal

Suplente:
L.A.E María del Rosario Ruiz Uribe

C.P.A. Gustavo Cesar Galindo
Secretario de la Contraloría

Suplente:
Arq. Ricardo Flores Villaseñor

Lic. Sergio Tabares Orozco
Regidor que Preside la Comisión de Obra Pública

Suplente:

Lic. Jose Luis Ayala Cornejo
Regidor que preside la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable

Suplente:

Mtro. Carlos Alberto Briseño Becerra
Regidor que preside la Comisión de Hacienda Publica

Suplente:
Mtro. Cesar Guillermo Ruvalcaba Gómez

Dra. María Candelaria Ochoa Ávalos
Regidora que preside la Comisión edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción

Suplente:

Ing. Jose Luis Moreno Rojas
Secretario de Obras Públicas

Suplente:
Ing. Juan Carlos Navarro Ruiz
Director de Construcción

Lic. José Francisco Castillo Madrigal
Secretario de Servicios Públicos Municipales

Suplente:
Ing. Alberto Arreola Castañeda

Arq. Diego Delfin Alvarez del Castillo.
Titular de la Comisión de Planeación Urbana de Guadalajara

Suplente:

ARQ. SERGIO H. BAEZA

Ing. Rigoberto Monturar Rizo
Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales

Suplente:
Lic. Jaime Fajardo Vázquez

Ing. Juan Carlos Navarro Ruiz.
Secretario Técnico de la Comisión

Suplente:
Arq. Luis Fernando De alba Perez

Ing. Alejandro Guevara Castellanos.
Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C

Suplente:
Ing. Hector Manuel Zepeda Angulo

Ricardo Rios Sosa

Arq. Luis Reynaldo Galvan Bermejo
Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C

Suplente:
Arq. Fausto Rangel Ramirez

Ing. Benjamin Cárdenas Chávez
Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Suplente:
Arq. Juan Manuel Deseinmann Arias

Ing. Luis Rubén Camberos Othón
Consejo para la Transparencia y la Ética Pública

Suplente:
Lic. Rafael Preciado Vargas

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA SESIÓN ORDINARIA 05/14 DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA CELEBRADA EL VIERNES 30 DE MAYO DE 2014 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 19 FRACCIÓN II, ARTÍCULO 22 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Inicio	Término	Contratista	Importe
8.1 Convenio Adicional (Ampliación y/o modificación de metas)							
CONTRATO ORIGINAL		**DICE:**					
1	OPG-R33-PAV-CI-C06-015/13	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE SUSTITUCIÓN DE RED HIDROSANITARIA, CAMBIO DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, SUSTITUCIÓN DE BANQUETA Y BALIZAMIENTO	PATRIA ENTRE BETHSUR Y ELIGIO ANCONA, EN LA COL. VILLAS DE GUADALUPE DE LA ZONA 4 OBLATOS. BETHSUR ENTRE AV. PATRIA Y SIRIA, EN LA COL. VILLAS DE GUADALUPE DE LA ZONA 4 OBLATOS	26-Jun-13	09-Sep-13	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	$ 4,714,480.75
CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO		**DEBIENDO DECIR:**					
1	OPG-R33-PAV-CI-C06-015/13	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE SUSTITUCIÓN DE RED HIDROSANITARIA, CAMBIO DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, SUSTITUCIÓN DE BANQUETA Y BALIZAMIENTO	PATRIA ENTRE BETHSUR Y ELIGIO ANCONA, EN LA COL. VILLAS DE GUADALUPE DE LA ZONA 4 OBLATOS. BETHSUR ENTRE AV. PATRIA Y SIRIA, EN LA COL. VILLAS DE GUADALUPE DE LA ZONA 4 OBLATOS	26-Jun-13	09-Sep-13	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	$ 4,714,480.75
		REPARACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BETHSUR ENTRE SIRIA Y MANUEL ALMENDARIZ, EN LA COL. VILLAS DE GUADALUPE DE LA ZONA 4 OBLATOS				
CONTRATO ORIGINAL		**DICE:**					
2	OPG-R33-PAV-CI-C06-019/13	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE SUSTITUCIÓN DE RED HIDROSANITARIA, CAMBIO DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, SUSTITUCIÓN DE BANQUETA Y BALIZAMIENTO	HACIENDA CIÉNEGA DE MATA ENTRE HACIENDA BELLAVISTA Y JUAN PABLO II, EN LA COL. TETLÁN RÍO VERDE DE LA ZONA 4 OBLATOS	26-Jun-13	09-Sep-13	Lim Constructora S.A. de C.V.	$ 4,063,910.27
CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO		**DEBIENDO DECIR:**					
2	OPG-R33-PAV-CI-C06-019/13	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE SUSTITUCIÓN DE RED HIDROSANITARIA, CAMBIO DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, SUSTITUCIÓN DE BANQUETA Y BALIZAMIENTO	HACIENDA CIÉNEGA DE MATA ENTRE HACIENDA BELLAVISTA Y JUAN PABLO II, EN LA COL. TETLÁN RÍO VERDE DE LA ZONA 4 OBLATOS	26-Jun-13	09-Sep-13	Lim Constructora S.A. de C.V.	$ 4,063,910.27
		REPARACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	HACIENDA CIENEGA DE MATA ENTRE HACIENDA DEL JARDIN Y HACIENDA DEL LENCERO, EN LA COL. TETLÁN RÍO VERDE DE LA ZONA 4 OBLATOS				
CONTRATO ORIGINAL		**DICE:**					
3	OPG-PEF-PAV-LP-CO9-072/13	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION DE LINEAS HIDROSANITARIA, TOMAS DOMICILIARIAS Y BANQUETAS.	AV. NORMALISTAS ENTRE DIEGO RIVERA Y AV. ALCALDE, EN LA COL. COLINAS DE LA NORMAL DE LA ZONA 1 CENTRO.	20-Sep-13	18-Dic-13	Cinco Contemporánea S.A. de C.V.	$ 34,776,936.21
CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO		**DEBIENDO DECIR:**					
3	OPG-PEF-PAV-LP-CO9-072/13	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION DE LINEAS HIDROSANITARIA, TOMAS DOMICILIARIAS Y BANQUETAS.	AV. NORMALISTAS ENTRE DIEGO RIVERA Y AV. ALCALDE, EN LA COL. COLINAS DE LA NORMAL DE LA ZONA 1 CENTRO. FRAY JUNÍPERO SERRA ENTRE AV. NORMALISTAS Y AV. DE LOS MAESTROS, EN LA COL. ALCALDE BARRANQUITAS DE LA ZONA 1 CENTRO. ENCARNACIÓN ROSAS ENTRE AV. NORMALISTAS Y AV. DE LOS MAESTROS, EN LA COL. ALCALDE BARRANQUITAS DE LA ZONA 1 CENTRO.	20-Sep-13	18-Dic-13	Cinco Contemporánea S.A. de C.V.	$ 34,776,936.21

Abstención

Abstención

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Inicio	Término	Contratista	Importe
			8.2 Convenio Adicional (Ampliación y/o modificación de metas)				
CONTRATO ORIGINAL		**DICE:**					
4	OPG-R33-PAV-AD-C12-084/13	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE RED HIDROSANITARIA, CAMBIO DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS Y BALIZAMIENTO.	FRANCISCO QUINTERO ENTRE JOAQUÍN GARCIA LEAL Y ALBINO CORZO, EN LA COL. LOMAS DEL RIO VERDE DE LA ZONA 4 OBLATOS	01-Nov-13	31-Dic-13	**Desarrollos Habitacionales y Urbanización, S.A. de C.V.**	**$ 1,591,200.00**
CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO		**DEBIENDO DECIR:**					
4	OPG-R33-PAV-AD-C12-084/13	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE RED HIDROSANITARIA, CAMBIO DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS Y BALIZAMIENTO.	FRANCISCO QUINTERO ENTRE JOAQUÍN GARCIA LEAL Y ALBINO CORZO, EN LA COL. LOMAS DEL RIO VERDE DE LA ZONA 4 OBLATOS JOAQUÍN GARZA LEAL ENTRE FRANCISCO QUINTERO Y HACIENDA BELLAVISTA, EN LA COL. LOMAS DEL RIO VERDE DE LA ZONA 4 OBLATOS	01-Nov-13	31-Dic-13	**Desarrollos Habitacionales y Urbanización, S.A. de C.V.**	**$ 1,591,200.00**
CONTRATO ORIGINAL		**DICE:**					
3	OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12	REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ETAPA	JESUS GARCIA S/N ENTRE SANTA MONICA Y MARIANO BARCENAS DE LA ZONA 1 CENTRO	08-Oct-12	05-Ene-13	**Bufete Arquitectónico S.A. de C.V.**	**$ 22,499,302.94**
CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO		**DEBIENDO DECIR:**					
						CONVENIO	**$ 3,889,796.66**
						PORCENTAJE DE CONVENIO	**17.29%**
3	OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12	REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ETAPA	JESUS GARCIA S/N ENTRE SANTA MONICA Y MARIANO BARCENAS DE LA ZONA 1 CENTRO	08-Oct-12	05-Ene-13	**Bufete Arquitectónico S.A. de C.V.**	**$ 26,389,099.60**

*** NOTA: CADA CONCEPTO SOMBREADO ES EL CAMBIO REALIZADO**

abstención

Abstención

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Inicio	Término	Contratista	Importe

Ing. Ramiro Hernández García
Presidente Municipal

Lic. Hugo de León Meza
Presidente de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública:

Lic. Francisco Padilla Villarruel
Tesorero Municipal

abstención

Suplente:
L.A.E Maria del Rosario Ruiz Uribe

C.P.A. Gustavo Cesar Galindo
Secretario de la Contraloría

Suplente:
Arq. Ricardo Flores Villaseñor

Lic. Sergio Tabares Orozco
Regidor que Preside la Comisión de Obra Pública

Suplente:

Lic. Jose Luis Ayala Cornejo
Regidor que preside la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable

Suplente:

Mtro. Carlos Alberto Briseño Becerra
Regidor que preside la Comisión de Hacienda Pública

Suplente:
Mtro. Cesar Guillermo Ruvalcaba Gómez

Dra. Maria Candelaria Ochoa Ávalos
Regidora que preside la Comisión edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción

Suplente:

Ing. Jose Luis Moreno Rojas
Secretario de Obras Públicas

Suplente:
Ing. Juan Carlos Navarro Ruiz
Director de Construcción

Lic. José Francisco Castillo Madrigal
Secretario de Servicios Públicos Municipales

Suplente:
Ing. Alberto Arreola Castañeda

Arq. Diego Delfin Alvarez del Castillo.
Titular de la Comisión de Planeación Urbana de Guadalajara

Suplente:

Arq. Sergio H. Baeza

Ing. Rigoberto Montufar Rizo
Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales

Suplente:
Lic. Jaime Fajardo Vázquez

Ing. Juan Carlos Navarro Ruiz.
Secretario Técnico de la Comisión

Suplente:
Arq. Luis Fernando De alba Perez

Ing. Alejandro Guevara Castellanos.
Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C

Suplente:
Ing. Hector Manuel Zepeda Angulo

Ricardo Rizo Sosa

Arq. Luis Reynaldo Galvan Bermejo
Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C

Suplente:
Arq. Fausto Rangel Ramirez

Ing. Benjamin Cárdenas Chávez
Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Suplente:
Arq. Juan Manuel Deseinmann Arias

Ing. Luis Rubén Camberos Othón
Consejo para la Transparencia y la Etica Pública

Suplente:
Lic. Rafael Preciado Vargas

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA SESIÓN ORDINARIA 05/14 DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA CELEBRADA EL VIERNES 30 DE MAYO DE 2014 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 19 FRACCIÓN II, ARTICULO 22 FRACCION I DEL RECLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Duración	Anticipo	Contratista	Importe
		9 Asuntos Varios (Modificaciones)					
AUTORIZACIÓN ORIGINAL DE SESIÓN 01/14		**DICE:**					
		DEPENDENCIA 2800 PROGRAMA 1 PROYECTO 12 UNIDAD RESPONSABLE 2801 PARTIDA 6140 "Ciudad Creativa Digital"					
1	OPG-OD-EYP-AD-C01-001/14	GDL CIUDAD CREATIVA DIGITAL, ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETICA (GEORADAR PARQUE MORELOS)	ZONA 1 CENTRO	60 dias	50%	Grupo Sandstorm Gam, S.A. de C.V.	$ 2,179,593.60
2	OPG-OD-EYP-AD-C01-002/14	GDL CIUDAD CREATIVA DIGITAL ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETICA (GEORADAR HIDALGO)	PREDIO # 1 EN AV. HIDALGO, DE LA ZONA 1 CENTRO	15 dias	50%	Grupo Sandstorm Gam, S.A. de C.V.	$ 466,180.80
3	OPG-OD-EYP-AD-C01-003/14	GDL CIUDAD CREATIVA DIGITAL, ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (EDIFICIO HIDALGO)	PREDIO # 1 EN AV. HIDALGO, DE LA ZONA 1 CENTRO	30 dias	50%	Grupo Sandstorm Gam, S.A. de C.V.	$ 163,455.60
4	OPG-OD-EYP-AD-C01-004/14	CIUDAD CREATIVA DIGITAL "PLAN MAESTRO NORMATIVO". PROYECTO URBANO.	PARQUE MORELOS Y ENTORNO URBANO INMEDIATO, DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA DE LA ZONA 1 CENTRO	75 dias	50%	Diseño y Planeación S.C.	$ 2,395,778.00
5	OPG-OD-EYP-AD-C01-005/14	LEVANTAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LA FINCA UBICADA EN BAEZA ALZAGA E INDEPENDENCIA	BAEZA ALZAGA No. 85, 89, 91, 93 Y 95 ESQUINA INDEPENDENCIA, EN LA ZONA 1 CENTRO	45 dias	50%	Prisma Ingeneria, S.A. de C.V.	$ 125,280.00
6	OPG-OD-EYP-AD-C01-006/14	LIMPIEZA Y ADECUACIONES A PREDIOS DE CIUDAD CREATIVA DIGITAL 1ra ETAPA.	ZONA 1 CENTRO	15 dias	50%	Obras y Materiales de Occidente, S.A. de C.V.	$ 1,850,000.00
7	OPG-OD-EYP-AD-C01-007/14	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA CUIDAD CREATIVA DIGITAL (CCD), 1ra ETAPA.	ZONA 1 CENTRO	45 dias	50%	Dis. Christian Alexander Maciel Tejeda	$ 551,000.00
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN		**DEBIENDO DECIR:**					
		2115 - 60 - 0000 - 00000 - 00000 "Ciudad Creativa Digital"					
1	OPG-OD-EYP-AD-C01-001/14	GDL CIUDAD CREATIVA DIGITAL, ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETICA (GEORADAR PARQUE MORELOS)	ZONA 1 CENTRO	60 dias	50%	Grupo Sandstorm Gam, S.A. de C.V.	$ 2,179,593.60
2	OPG-OD-EYP-AD-C01-002/14	GDL CIUDAD CREATIVA DIGITAL ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETICA (GEORADAR HIDALGO)	PREDIO # 1 EN AV. HIDALGO, DE LA ZONA 1 CENTRO	15 dias	50%	Grupo Sandstorm Gam, S.A. de C.V.	$ 466,180.80
3	OPG-OD-EYP-AD-C01-003/14	GDL CIUDAD CREATIVA DIGITAL, ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (EDIFICIO HIDALGO)	PREDIO # 1 EN AV. HIDALGO, DE LA ZONA 1 CENTRO	30 dias	50%	Grupo Sandstorm Gam, S.A. de C.V.	$ 163,455.60
4	OPG-OD-EYP-AD-C01-004/14	CIUDAD CREATIVA DIGITAL "PLAN MAESTRO NORMATIVO". PROYECTO URBANO.	PARQUE MORELOS Y ENTORNO URBANO INMEDIATO, DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA DE LA ZONA 1 CENTRO	75 dias	50%	Diseño y Planeación S.C.	$ 2,395,778.00
5	OPG-OD-EYP-AD-C01-005/14	LEVANTAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LA FINCA UBICADA EN BAEZA ALZAGA E INDEPENDENCIA	BAEZA ALZAGA No. 85, 89, 91, 93 Y 95 ESQUINA INDEPENDENCIA, EN LA ZONA 1 CENTRO	45 dias	50%	Prisma Ingeneria, S.A. de C.V.	$ 125,280.00
6	OPG-OD-EYP-AD-C01-006/14	LIMPIEZA Y ADECUACIONES A PREDIOS DE CIUDAD CREATIVA DIGITAL 1ra ETAPA.	ZONA 1 CENTRO	15 dias	50%	Obras y Materiales de Occidente, S.A. de C.V.	$ 1,850,000.00
7	OPG-OD-EYP-AD-C01-007/14	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA CUIDAD CREATIVA DIGITAL (CCD), 1ra ETAPA.	ZONA 1 CENTRO	45 dias	50%	Dis. Christian Alexander Maciel Tejeda	$ 551,000.00

*** NOTA: CADA CONCEPTO SOMBREADO ES EL CAMBIO REALIZADO**

Abstención

No.	No. Contrato	Obra	Ubicación	Duración	Anticipo	Contratista	Importe

Ing. Ramiro Hernández García
Presidente Municipal

Lic. Hugo de León Meza
Presidente de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública:

Lic. Francisco Padilla Villarruel
Tesorero Municipal

Suplente:
L.A.E María del Rosario Ruiz Uribe

C.P.A. Gustavo Cesar Galindo
Secretario de la Contraloría

Suplente:
Arq. Ricardo Flores Villaseñor

Lic. Sergio Tabares Orozco
Regidor que Preside la Comisión de Obra Pública

Suplente:

Lic. Jose Luis Ayala Cornejo
Regidor que preside la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable

Suplente:

Mtro. Carlos Alberto Briseño Becerra
Regidor que preside la Comisión de Hacienda Publica

Suplente:
Mtro. Cesar Guillermo Ruvalcaba Gómez

Dra. María Candelaria Ochoa Ávalos
Regidora que preside la Comisión edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción

Suplente:

Ing. Jose Luis Moreno Rojas
Secretario de Obras Públicas

Suplente:
Ing. Juan Carlos Navarro Ruiz
Director de Construcción

Lic. José Francisco Castillo Madrigal
Secretario de Servicios Públicos Municipales

Suplente:
Ing. Alberto Arreola Castañeda

Arq. Diego Delfin Alvarez del Castillo.
Titular de la Comisión de Planeación Urbana de Guadalajara

Suplente:

ARQ. SERGIO H. BAEZA

Ing. Rigoberto Montalvo Rizo
Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales

Suplente:
Lic. Jaime Fajardo Vázquez

Ing. Juan Carlos Navarro Ruiz.
Secretario Técnico de la Comisión

Suplente:
Arq. Luis Fernando De alba Perez

Ing. Alejandro Guevara Castellanos.
Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C

Suplente:
Ing. Hector Manuel Zepeda Angulo

Ricardo R. Toscano

Arq. Luis Reynaldo Galvan Bermejo
Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C

Suplente:
Arq. Fausto Rangel Ramirez

Ing. Benjamin Cárdenas Chavez
Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Suplente:
Arq. Juan Manuel Descinmann Arias

Ing. Luis Rubén Camberos Othón
Consejo para la Transparencia y la Ética Pública

Suplente:
Lic. Rafael Preciado Vargas

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA SESIÓN ORDINARIA 05/14 DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA CELEBRADA EL VIERNES 30 DE MAYO DE 2014 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 19 FRACCIÓN II, ARTICULO 22 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Sesión Ordinaria 04/14 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las **13:00 horas** del **Lunes 11 de Abril de 2014,** en la sala de capacitación del segundo nivel de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en Calle Hospital 50-z, Colonia El Retiro en la zona Uno Centro; se reunieron en **SESIÓN ORDINARIA 04/14,** los miembros de la **COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA**, asistiendo a ésta: el **Lic. Hugo de León Meza,** Presidente de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública, **Lic. Francisco Padilla Villaruel,** Tesorero Municipal, **Arq. Ricardo Flores Villaseñor,** Suplente Secretaria de la Contraloría, **C.P. Mario Alberto Salazar Madera,** Suplente Regidor que Preside la Comisión de Obra Pública, **Mtro. Cesar Guillermo Ruvalcaba Gomez,** Suplente Regidor que preside la Comisión de Hacienda Pública, **Dra. Maria Candelaria Ochoa Avalos,** Regidora que preside la Comisión edilicia de Transparencia Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, **Ing. José Luís Moreno Rojas,** Secretario de Obras Publicas, **Ing. Alberto Arreola Castañeda,** Suplente Secretario de Servicios Públicos Municipales, **Arq. Liliana Lopez Ruelas,** Suplente Titular de la Comisión de Planeación Urbana de Guadalajara, **Ing. Rigoberto Montufar Rizo,** Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales, **Ing. Juan Carlos Navarro Ruiz,** Secretario Técnico de la Comisión, **Ing. Héctor Manuel Zepeda Angulo,** Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C., **Arq. Luís Reynaldo Galván Bermejo,** Representante del Colegio de Arquitectos, **Arq. Juan Manuel Deseimann Arias,** Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, **Ing. Luís Rubén Camberos Othon,** Consejo para la Transparencia y la Ética Pública.

El Presidente de la Comisión, Lic. Hugo de León Meza, bien buenas tardes vamos a dar inicio a esta sesión ordinaria de la comisión de adjudicación de obra pública, le pido al secretario técnico a bien nombrar lista de asistencia.

Secretario Técnico, Ing. Juan Carlos Navarro Ruiz, buenos días a todos ya circulo la lista de firmas con los presentes, constatando que contamos con quórum legal, para continuar.

El Presidente de la Comisión, Lic. Hugo de León Meza, una vez confirmado el quórum legal para sesionar, se declaran válidos los acuerdos que aquí se tomen, pongo a su consideración la propuesta de orden del día para esta sesión:

1.- Lista de Asistencia.

2.- Confirmación de quórum legal para sesionar

3.- Firma del acta de la sesión ordinaria 03/14.

La Secretaría de Obras Públicas presenta:

4.- Obras propuestas para adjudicación directa (AD)

5.- Obras propuestas para concurso por invitación (CI)

6.- Obras propuestas para licitación pública (LP)

7.- Asuntos Varios.

Pongo a su consideración de ustedes si hay alguien que quiera hacer uso de la palabra, bien se pone a consideración de votación si a de aprobarse la orden del día sírvanse manifestando levantando la mano.

Aprobado por unanimidad, muy bien ya desahogados el punto uno y el punto 2 pasaríamos al punto 3 que es la firma del acta de la sesión ordinaria, la cual con anticipación se les hizo llegar, por lo que va a circular para su firma. A continuación el punto número 4, la Secretaría de Obras Públicas presenta, Obras para Adjudicación Directa; adelante señor secretario.

Sesión Ordinaria 04/14 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública.

Ing. José Luís Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas: Buen día señor presidente de esta comisión pongo a su consideración y a todos los miembros de esta comisión, las obras propuestas para adjudicación directa, sólo haciendo una aclaración, en la primera adjudicación OPG-OD-EQP-AD-C04-020/14 que tiene 2 obras, REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO DE OBRAS PÚBLICAS y REMODELACIÓN DE OFICINAS DE CATASTRO, se va omitir esta ultima a petición del director de Catastro presente, para posteriormente verlo, por lo que quedaría:

Número de contrato: **OPG-OD-EQP-AD-C04-020/14**

Obra: REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO DE OBRAS PÚBLICAS

Ubicación: HOSPITAL No.50-Z ESQ. ESMERALDA, EN LA COL. EL RETIRO DE LA ZONA 1 CENTRO

Duración: 60 días, **Anticipo:** 30%

Contratista: Ing. Verónica Bermúdez Torres

Importe: $1'100,000.00

Aquí está el director de Catastro por alguna aclaración y se queda únicamente la Rehabilitación del edificio de Obras Públicas.

El Presidente de la Comisión, Lic. Hugo de León Meza, bien entonces la obra de Catastro se retira de esta orden del día, esta aquí el director de Catastro por si tienen algún comentario al respecto, adelante señor director, si nos quiere hacer un comentario.

Director de Catastro, Dr. Saúl Joaquín Figueroa López, para agradecer las atenciones recibidas por la Secretaría de Obras Públicas, con objeto en lo que refiere a la REMODELACIÓN DE OFICINAS DE CATASTRO, consideramos que toda vez que no todavia no se tiene una asignación presupuestaria completa y seria nada más una parcialidad, vamos estableciendo que es preferible esperar todos los documentos, sobre todo la asignación presupuestal para hacer un trabajo completo, no me queda más que agradecer las atenciones que hemos recibido del titular de la Secretaría de Obras Públicas, que siempre estuvo atento a apoyarnos y a regresarnos todo lo que de alguna manera habíamos solicitado y agradezco la atención que nos han dado de presentarlo a la brevedad, muchas gracias.

Ing. José Luís Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas: Gracias doctor, muy amable. Bueno continuamos.

Número de contrato: **OPG-OD-PAV-AD-C04-021/14**

Obra: RENOVACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO

Ubicación: AV. RIVERA ENTRE LAURO BADILLO DÍAZ Y BAJÍO, EN LA COL. ÁLAMO INDUSTRIAL DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR

Duración: 90 días, **Anticipo:** 30%

Contratista: Construcciones y Proyectos SAG S.A. de C.V

Importe: $1'500,000.00

Aquí les quiero comentar que este es el límite entre Guadalajara y Tlaquepaque, dicho municipio va a rehabilitar, pavimentar su calle, así como cambiar líneas de agua y drenaje, se nos pidió nuestra intervención para entre los 2 dejar la vialidad completa y no sólo la mitad de la calle, entonces el municipio de Guadalajara rehabilita 2 cuadras y la otra mitad la rehabilita Tlaquepaque, continuando tenemos:

Número de contrato: **OPG-OD-IHS-AD-C04-022/14**

Sesión Ordinaria 04/14 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública.

Obra: A) SANEAMIENTO DEL CANAL DEL SUR (DESAZOLVE), B) SANEAMIENTO DE CANAL PLUVIAL NUEVA ESPAÑA (DESAZOLVE).

Ubicación: A) LUIS COVARRUBIAS ENTRE DAVID BERNAGA A 3 DE MAYO, EN LA COL. BALCONES DEL 4 EN LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, B) PROL. AV. COLON ENTRE FRANCISCO OSORNIO Y SECOYA, DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR.

Duración: 30 días, **Anticipo:** 30%

Contratista: Tercerías y Pavimentos G&A, S.A. de C.V.

Importe: $2'451,836.36

Número de contrato: **OPG-OD-IHS-AD-C04-023/14**

Obra: A) SANEAMIENTO DEL CANAL PLUVIAL MIRAVALLE (DESAZOLVE), B) SANEAMIENTO DEL CANAL HIGUERILLAS (DESAZOLVE), C) SANEAMIENTO DEL VASO REGULADOR BALCONES DEL 4 (DESAZOLVE).

Ubicación: A) LUIS COVARRUBIAS ENTRE ARTES PLÁSTICAS Y 3 DE MAYO, EN LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, B) CALZ. LÁZARO CÁRDENAS Y RAMAL DEL FERROCARRIL, EN EL PARQUE LIBERACIÓN DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, C) AV. JESÚS REYES HEROLES Y RAFAEL MOLINA, EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR

Duración: 30 días, **Anticipo:** 30%

Contratista: Consorcio Constructor Diestro S.A. de C.V.

Importe: $1'690,658.74

Número de contrato: **OPG-OD-IHS-AD-C04-024/14**

Obra: A) SANEAMIENTO DEL VASO REGULADOR VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS (DESAZOLVE), B) SANEAMIENTO VASO REGULADOR 5 DE MAYO (DESAZOLVE).

Ubicación: A) AV. JESÚS REYES HEROLES Y MARIA C. BANCALARI, EN LA COL. LOMA LINDA DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, B) AV. PATRIA Y JOSE MARIA MÉNDEZ OLIVARES Y DOMINGO LOEZA, EN LA COL. 5 DE MAYO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR,

Duración: 30 días, **Anticipo:** 30%

Contratista: Edificaciones Miller, S.R.L. de C.V.

Importe: $1'669,209.33

Número de contrato: **OPG-OD-IHS-AD-C04-025/14**

Obra: A) SANEAMIENTO DEL CANAL CIENEGA DE MATA 1, B) SANEAMIENTO Y DESAZOLVE DEL CANAL LUIS LARA, C) SANEAMIENTO Y DESAZOLVE DEL CANAL FOVISSSTE ESTADIO

Ubicación: A) CIENEGA DE MATA ENTRE HACIENDA DE TALA Y HACIENDA LA CALERA, EN LA COL. HELIODORO HERNANDEZ LOZA DE LA ZONA 4 OBLATOS, B) CANAL LUIS LARA ENTRE CELERINO NAVARRO A IGNACIO MEJÍA, EN LA COL. LOMAS DEL PARAÍSO DE LA ZONA 3 HUENTITAN, C) AV. PATRIA ENTRE MONTE SAN ELÍAS A CALZADA INDEPENDENCIA, EN LA COL. FOVISSSTE ESTADIO DE LA ZONA 3 HUENTITAN

Duración: 30 días, **Anticipo:** 30%

Sesión Ordinaria 04/14 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública.
Contratista: Constructora Cova y Asociados S de R L de C.V.

Importe: $1'490,857.10

Número de contrato: **OPG-CONACULTA-EQP-CI-C04-026/14**

Obra: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL MUSEO PANTEÓN DE BELÉN

Ubicación: CALLE BELÉN 684, ENTRE HOSPITAL Y JESÚS GARCÍA, EN LA COL. ALCALDE BARRANQUITAS DE LA ZONA 1 CENTRO

Duración: 60 días, **Anticipo:** 30%

Contratista: Grupo Constructor Contemporáneo S.A. de C.V

Importe: $1'007,500.00

Número de contrato: **OPG-CONACULTA-EQP-CI-C04-027/14**

Obra: "RESTAURACIÓN DE LA CASA REFORMA"

Ubicación: REFORMA NÚMEROS 363, 367, 369 Y 373, EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA ZONA 1 CENTRO

Duración: 150 días, **Anticipo:** 30%

Contratista: Napreco Grupo Constructor S.A. de C.V.

Importe: $4'000,000.00

Esto es lo que se refiere en cuanto a adjudicaciones directas señor presidente.

El Presidente de la Comisión, Lic. Hugo de León Meza, pongo a comentarios al respecto, adelante señor Regidor.

Mtro. Cesar Guillermo Ruvalcaba Gómez, Suplente Regidor que preside la Comisión de Hacienda Pública, muchas gracias señor presidente Lic. Hugo de León, yo quisiera a todos los presentes y a usted presidente, informales que en esta sesión voy a votar en abstención en todos y cada uno de los temas que se van a tratar aquí, pero quisiera expresar el razonamiento y el fundamento de los motivos que me llevan a ello, yo creo que la comisión de adjudicación de Obra Pública no es un tema menor, y todos los que la integran ya sean parte del gobierno municipal de Guadalajara o instituciones, organismos que participan, saben la relevancia que tiene, porque es la ejecución del dinero de los ciudadanos, porque aquí lo que estamos realizando es que se puedan gastar cada peso y cada centavo de la manera correcta y en beneficio de la ciudad cuidando que en todo momento cada adjudicación, cada licitación, cada invitación tenga todos los elementos necesarios para que pueda ser productiva y pueda tener toda la seguridad de que se están haciendo bien las cosas conforme a los reglamentos, para que esto se pueda dar, es fundamental que tengamos información suficiente y necesaria para poder revisar cada uno de los temas, de otra manera estamos votando a ciegas y hasta el día de hoy con toda la información que llega en el cuadro que se nos hace llegar a cada comisión, al menos aún servidor no le es suficiente para poder tomar una determinación o para poder hacer una evaluación de manera racional y cierta, en cada uno de los puntos que estamos tratando, en el caso de las adjudicaciones, las que son por invitación y licitaciones, debemos conocer no solamente la descripción de lo que se va a realizar de manera detallada, si no saber además del monto, cual es la empresa que se va a hacerse cargo de la obra, pero también saber cuál es el historial de esa empresa, para poder determinar si es la adecuada o no en cada una de las obras, debemos conocer al menos el currículum profesional de cada una de ellas, cosa que no se anexa en la información que nos hacen llegar, pero tampoco se anexa cuantas veces se le ha dado obra en esta administración o en las anteriores a cada una de las empresas, ya lo habían propuesto

en una sesión pasada, para poder tener una contabilidad para saber cuántos y a quienes se les está dando Obra Pública y en el caso de que hayan sido repetidas ocasiones en las que se da Obra Pública a una empresa, que tenga toda la justificación necesaria para que sea de esa manera, yo en ningún momento quiero inferir que se estén haciendo las cosas de manera inadecuada y que sean las mejores empresas las que estén ganando o teniendo cada una de las licitaciones o invitaciones que están aquí, pero lo que si quiero decir es que yo no lo sé, al menos con el cuadro y con la información que nos hacen llegar, yo no puedo tener los fundamentos para emitir una opinión, yo hice de manera institucional en la sesión pasada una observación para poder ampliar la información que nos llega, previo a cada una de estas sesiones, pero además el tiempo con el que nos llega la información, a fin de poder hacer un escrutinio minucioso de cada uno de los temas, lo cual tampoco se cubrió y la información que hasta este momento me hacen llegar a mi no me hacen llegar, a mi no me permite poder emitir un juicio de manera fundamentada, por lo tanto y lo sucesivo, mientras no se complemente la información emitida, el currículum de cada una de las empresa, el historial de licitaciones, de adjudicaciones, de invitaciones que se le han hecho a cada una de ellas, argumentar si es una obra complementaria, porque es una obra complementaria, yo veo varios casos en los que se está dando una ampliación presupuestal y que muchos de los objetivos que cubre la ampliación estaban en la asignación principal, y no se nos explica de manera fundamentada, cual fue el motivo que origino que hoy se requiera más recurso parta terminar lo que ya estaba argumentado, por lo tanto y mientras en lo sucesivo no se cumpla esta parte, yo no podré votar a favor, yo lamentaría mucho que el tenor de esta comisión sea no generar la información requerida.

El Presidente de la Comisión, Lic. Hugo de León Meza, ¿alguien más desea hacer un comentario al respecto? Adelante

Arq. Ricardo Flores Villaseñor, Suplente Secretaria de la Contraloría, yo nada más una duda que me gustaría que se me aclarará, en cuanto a la última adjudicación de CONACULTA que es fundamentada en el artículo 42 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas, fracción VIII, dice *"Se trate de trabajos de mantenimiento, restauración, reparación y demolición de inmuebles…"*, me queda claro, pero lo siguiente me gustaría que se me aclarará por favor : *"en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos, cantidades de trabajo, determinar las especificaciones correspondientes o elaborar el programa de ejecución;"* me gustaría encontrarle alguna relación entre la justificación o lo que dice este articulo.

Ing. José Luís Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas, ¿cuál de la obras?

Ing. Juan Carlos Navarro Ruiz, Secretario Técnico de la Comisión, la de CONACULTA.

Ing. José Luís Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas, el Panteón Belén se le asigno a esta empresa por que viene trabajando con una asignación del 2013, se va a hacer en etapas, es una inversión muy cuantiosa y no era posible sacarla en un año, entonces en el 2013 se les dio la una asignación y ahora en el 2014 tiene otra asignación de $1'007,500.00 y es una especialidad en restauración, es una de las empresas registradas como restauradoras y el Instituto Nacional de Antropología e Historia nos las recomendó y en el otro caso de la Restauración de la Casa Reforma es la primer etapa, porque la Rehabilitación llevaría más de $16'000'000.00 de pesos y está primer asignación es para una empresa que tiene experiencia en edificación, es por eso que se le asigna.

Arq. Ricardo Flores Villaseñor, Suplente Secretaria de la Contraloría, si me queda claro la especialidad que las empresas pudieran tener, lo que me gustaría que se me explique un poquito más es que en la fundamentación en donde se basan dice que siempre y cuando no *"…sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos, cantidades de trabajo, determinar las especificaciones correspondientes o elaborar el programa de ejecución;"*

Ing. José Luís Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas, tu lo estás mencionando, aquí no es posible mencionar el alcance en esta restauración, esto es lo que tenemos asignado para este 2014 y le vamos a

invertir hasta donde alcancemos, no sabemos que alcance tengamos en esta casa, no tenemos el recurso para hacerlo en un solo año, porque vale más de $16'000'000.00

Arq. Ricardo Flores Villaseñor, Suplente Secretaria de la Contraloría, vamos generando un catálogo de conceptos en el proceso.

Ing. Juan Carlos Navarro Ruiz, Secretario Técnico de la Comisión, ayer tuvimos una junta con la persona que realizo el proyecto de restauración el arquitecto Canales, la persona reconocida por el INAH para esta situación, de hecho el va a ser el perito, son trabajos en donde a la hora de ir empezando a ver la estructura se van a ir tomando las determinando las acciones, es prácticamente imposible ahorita poder determinar la volumetría y las acciones, no definitivas, si no aproximadas muchas acciones, de hecho ya se acordó tener una visita en la obra para empezar a ver como lo menciona el secretario el costo total de la restauración de toda la finca $16'000,000.00 posiblemente no alcancen, es lo que autorizo CONACULTA como primer etapa, lo que se pretende es quitar el apuntalamiento para que ya quede la banqueta libre y pueda transitar la gente, pero para poder quitar ese apuntalamiento tenemos que reforzar la fachada y la restauración de la cubierta, prácticamente es para lo que se tiene destinado.

Arq. Ricardo Flores Villaseñor, Suplente Secretaria de la Contraloría, ¿y en cuanto a lo que se tiene como saneamiento de los canales que no tenemos un catálogo de conceptos que nos oriente que son los trabajos que se van a hacer? Se los hemos pedido en reiteradas ocasiones, no se nos ha proporcionado, pero bueno yo sugeriría aquí que si no se han contemplado estos conceptos se contemplen los levantamientos iníciales y finales para poder tener una medición correcta.

Ing. José Luís Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas, si tenemos un estimado del volumen que se va a sacar en cada canal, porque hay que hacer un recorrido a lo largo de todos los canales, recolectar toda la basura que tengamos y el saneamiento más o menos cuantificado tenemos el volumen inicial, seguimos con el topógrafo y el final, y ahí sacamos exactamente el volumen

Arq. Ricardo Flores Villaseñor, Suplente Secretaria de la Contraloría, es lo que yo decía, ese control.

Ing. José Luís Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas, si lo tenemos.

C.P. Mario Alberto Salazar Madera, Suplente Regidor que Preside la Comisión de Obra Pública, Quería preguntar si en el caso de las obras de CONACULTA, las empresas tienen algún aval, no sé si por parte del INAH o algún otro organismo estatal, que tengan la seguridad que vayan a realizar un buen trabajo de reforzamiento, que las empresas tenga esa especialidad y prácticamente un conocimiento en conservación de patrimonio.

Ing. José Luís Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas, en el caso del Panteón Belén nos dieron a 3 o 4 empresas desde el año pasado, se eligió a esta empresa que está haciendo la rehabilitación, está es la segunda asignación que se le da en el 2014, es una empresa especializada en restauración, en el caso de la Casa Reforma es una empresa que tiene experiencia en edificación y se le asigna, no se requiere la especialización de restauración.

Ing. Juan Carlos Navarro Ruiz, Secretario Técnico de la Comisión, de hecho en el caso de la Casa Reforma después se les vamos a presentar a autorización de ustedes también, un contrato con la persona que hizo el proyecto el arquitecto Canales, que es el reconocido por el INAH, para que este al pendiente de absolutamente de todos los trabajos, el básicamente nos pidió un traje a la medida nos dijo "yo solamente quiero que me pongan a una empresa que lo que yo lo diga lo haga, que no entremos en discusión, que tenga conocimiento, me interesa mucho participar en el proceso de la restauración" él se comprometió, las oficinas están a la vuelta, entonces ahí vamos a estar monitoreando todos los días los trabajos, entonces nos da la confianza del respaldo del restaurador del arquitecto Canales, que va a estar prácticamente de planta en los trabajos.

El Presidente de la Comisión, Lic. Hugo de León Meza, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? Bien, si señor secretario.

Lic. Francisco Padilla Villaruel, Tesorero Municipal, me parece muy bien que se vaya viendo a quien van a contratar, quienes participan, y a quien se le dan las obras, sólo a las que se refieren a los fondos federales, no nos han llegado, por lo tanto, si bien es cierto que podemos tener cierta certeza de que nos van a llegar próximamente, la contratación debe hacer una vez que caiga el dinero, entonces cae en la aprobación, pero sujeta de alguna manera a que vaya a haber los fondos federales para poder solventar estas obras.

Ing. José Luís Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas, yo quisiera comentar aquí al respecto, estos son fondos ya comprometidos que tienen ya las diferentes dependencias aseguradas, Secretaría de Cultura del municipio con CONACULTA México y está en trámite la asignación, únicamente estamos queriendo aventajarle, para tenerlo ya autorizado en la CAOP, si nos retrasaríamos mes o mes y medio a tener una CAOP, entonces esto está sujeto a que ustedes nos digan ya se registraron los fondos, estamos adelantando nada más el tiempo y el procedimiento para ahorrarnos un mes ahí.

El Presidente de la Comisión, Lic. Hugo de León Meza, bien se pone a votación las propuestas y quien esté a favor les ruego los manifiesten levantando la mano. ¿Quiénes estén por la abstención?

A favor: Lic. Hugo de León Meza, Lic. Francisco Padilla Villaruel, C.P. Mario Alberto Salazar Madera Dra. Maria Candelaria Ochoa Avalos, Ing. José Luís Moreno Rojas, Ing. Alberto Arreola Castañeda, Arq. Liliana Lopez Ruelas, Ing. Rigoberto Montufar Rizo, Ing. Juan Carlos Navarro Ruiz, Ing. Héctor Manuel Zepeda Angulo, Arq. Luís Reynaldo Galván Bermejo, Arq. Juan Manuel Deseimann Arias, Ing. Luís Rubén Camberos Othon

Abstención: Mtro. Cesar Guillermo Ruvalcaba Gómez, Arq. Ricardo Flores Villaseñor

Muy bien, pasando al siguiente punto, Obras propuestas por Concurso por Invitación, adelante señor Secretario.

Ing. José Luís Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas, para Obras propuestas por Concurso por Invitación tenemos

Número de contrato: **OPG-CONADE-EQP-CI-C04-028/14**

Obra: REMODELACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Nº 9 "PLAN DE SAN LUIS". TRABAJOS CONSISTENTES EN GIMNASIO DE BOX, MODULO DE JUEGOS Y APARATOS

Ubicación: SAN IGNACIO No. 2332 ESQ. HDA. GUADALUPE, EN LA COL. SAN VICENTE DE LA ZONA 4 OBLATOS

Duración: 150 días, **Anticipo:** 30%

Invitados:

- Corporativo Constructor Cutema S.A. de C.V.
- Urbanizaciones Sophia S.A. de C.V.
- Ropla Ingenieros & Arquitectos S.A. de C.V.
- Ing. José Luís Frausto Miranda

El Presidente de la Comisión, Lic. Hugo de León Meza, ¿en que consiste señor Secretario?

Ing. José Luís Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas, trabajos de albañilería, juegos infantiles, gimnasio, pisos, todo lo que lleva una unidad deportiva que estamos rehabilitando.

Número de contrato: **OPG-CONADE-EQP-CI-C04-029/14**

Obra: REMODELACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Nº 19 "CADETE VICENTE SUÁREZ". TRABAJOS CONSISTENTES EN PISTA DE BICICROSS, MODULO DE BAÑOS, MODULO DE JUEGOS Y APARATOS EJERCITADORES

Sesión Ordinaria 04/14 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública.

Ubicación: AV. DE LA CRUZ No. 1950 ESQ. MESA CENTRAL, EN LA COL. SAN MARCOS DE LA ZONA 4 OBLATOS

Duración: 150 días, **Anticipo:** 30%

Invitados:

- RS Obras y Servicios, S.A. de C.V.
- Constructora Tzaulan, S.A. de C.V.
- Constructora y Edificadora Romac, S.A. de C.V.
- Servicios Constructivos e Ingeniería, S.A. de C.V.

Número de contrato: **OPG-CONADE-EQP-CI-C04-030/14**

Obra: REMODELACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Nº 04 "FRANCISCO JAVIER MINA". TRABAJOS CONSISTENTES EN

Ubicación: PRESA LAUREL No. 137 ESQ. DIONISIO RODRÍGUEZ, EN LA COL. JARDINES DE SAN FRANCISCO DE LA ZONA 6 TETLAN.

Duración: 150 días, **Anticipo:** 30%

Invitados:

- Innovaciones en Mobiliario Urbano, S.A. de C.V.
- Constructora Larios Gutiérrez S.A. de C.V
- Arkal Grupo Constructor S.A. de C.V.
- Construjal, S.A. de C.V.

Número de contrato: **OPG-CONADE-EQP-CI-C04-031/14**

Obra: REMODELACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA N° 7 "HÉROES DE CHAPULTEPEC". TRABAJOS CONSISTENTES EN

Ubicación: NICOLÁS ROMERO No. 1477 ESQ. JAIME NUNÓ, EN LA COL. CHAPULTEPEC COUNTRY DE LA ZONA 1 CENTRO.

Duración: 150 días, **Anticipo:** 30%

Invitados:

- Ingeniería y Construcciones Anrol. S.A. de C.V.
- Constructora y Edificaciones Remi y Asociados S.A. de C.V.
- Grupo Constructor Xolot S.A. de C.V.
- Ing. Jorge Saul Muñoz Aceves

Número de contrato: **OPG-CONACULTA-EQP-CI-C04-032/14**

Obra: "REHABILITACIÓN DEL TEATRO TORRES BODET"

Sesión Ordinaria 04/14 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública.

Ubicación: AV. ESPAÑA ESQ. CON AV. CHAPULTEPEC SUR, EN LA COL. MODERNA DE LA ZONA 1 CENTRO

Duración: 150 días, **Anticipo:** 30%

Invitados:

- Margru Construcciones, S.A. de C.V
- Ciarco Constructora S.A. de C.V.
- Construcciones y Concreto Moreno S.A. de C.V.
- SCH Edificaciones S. de R.L. de C.V

También en Concursos por Invitación se está contemplando las cuadrillas para desazolves en todo el temporal de lluvias.

Número de contrato: **OPG-OD-IHS-CI-C04-033/14**

Obra: CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRÁULICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL TEMPORAL DE LLUVIAS EN LA CIUDAD

Ubicación: EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD

Duración: 150 días, **Anticipo:** 30%

Invitados:

- Logística Constructiva S.A. de C.V.
- Acaspoluca Consultaría y Construcción S.A de C.V
- Roalde Construcciones, S.A. de C.V.
- Suma Terra Obras y Proyectos, S.A. de C.V.

Sería todo señor presidente.

El Presidente de la Comisión, Lic. Hugo de León Meza, adelante señor Regidor

Mtro. Cesar Guillermo Ruvalcaba Gómez, Regidor que preside la Comisión de Hacienda Pública, una solicitud para que quede asentado, hay en lo que acaba de mencionar el ingeniero José Luís Moreno, algunas unidades deportivas que ya habían sido intervenidas con recursos del año anterior, en este caso hubo una serie de catálogos de conceptos que deberían cubrir cada unidad y tu vez eso, por ejemplo la de Plan de San Luís, que es una continuación y muchos de lo que aquí se está previendo con la rehabilitación de la alberca y eso, estaban en la asignación anterior, quisiera solicitar un informe detallado de los alcances y que sucedió con la anterior inversión, porque no se cumplió, si es que así lo fuera todos los objetivos de lo que se había planteado en los catálogos de conceptos anteriores y porque la necesidad ahora de hacer esta, digamos segunda etapa, en este caso, lo mismo sucede con la unidad Héroes de Chapultepec, es el mismo ejemplo, que también ya había sido intervenida con recursos y este es un segundo momento, sólo para diferenciar que cosas constaban en la pasada y cuales en esta y que evidentemente no se esté cubriendo en este momento por lo que ya haya sido motivo de licitación, vaya invitación en este caso, en el caso de la rehabilitación del Teatro Torres Bodet, aquí tengo entendido que ya se está interviniendo.

Ing. José Luís Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas, No.

Mtro. Cesar Guillermo Ruvalcaba Gómez, Regidor que preside la Comisión de Hacienda Pública, hay algo de obra.

Ing. José Luís Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas, no hay recurso de Guadalajara del 2013 o 2014 en el Teatro Torres Bodet.

Mtro. Cesar Guillermo Ruvalcaba Gómez, Regidor que preside la Comisión de Hacienda Pública, Bueno ahorita hay obra ahí, en el Torres Bodet y están haciendo algún refuerzo, no se si con un recurso del año anterior o algo.

Ing. José Luís Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas, recurso de Guadalajara no hay del 2012 o 2013 repito, probablemente es algún recurso del estado y este recurso es municipal.

Mtro. Cesar Guillermo Ruvalcaba Gómez, Regidor que preside la Comisión de Hacienda Pública, el año pasado tesorero, perdón por romper el protocolo, ¿el año pasado no habíamos asignado algún presupuesto para la Rehabilitación del Torres Bodet?

Lic. Francisco Padilla Villaruel, Tesorero Municipal, la verdad no lo recuerdo en este momento, pero lo investigo.

Mtro. Cesar Guillermo Ruvalcaba Gómez, Regidor que preside la Comisión de Hacienda Pública, hay en este momento una obra ejecutándose ahí, o al menos hace 12 horas.

Ing. José Luís Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas, lo aclaramos pero yo te aseguro que recurso municipal no hay ni 2012 ni 2013.

Mtro. Cesar Guillermo Ruvalcaba Gómez, Regidor que preside la Comisión de Hacienda Pública, no a lo mejor no, pero lo que si hay ahorita es obra, ver lo que están haciendo y ver si es complementaria a lo que aquí se va a realizar y en el caso de los concursos por invitación para prevención de temporal de lluvias en la ciudad, en este caso por ejemplo se presupuesta ¿en base a qué? Evidentemente entiendo que son emergencias, para el fondo que se va ahorita a concursar por invitación se prevé dotar una cuadrilla de las herramientas y los elementos o se hace en base a posibles contingencias que se puedan tener.

Ing. José Luís Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas, a la empresa que vaya a ganar se le pide que tenga cuadrilla permanente las 24 horas y a la hora que empiece a llover este al pendiente que no tengamos inundaciones y con gran éxito porque en el temporal de lluvias del 2013 en la ciudad de Guadalajara que pusieran en peligro algunos habitantes.

Mtro. Cesar Guillermo Ruvalcaba Gómez, Regidor que preside la Comisión de Hacienda Pública, ¿Cómo se calcula el pago?

Ing. José Luís Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas, se tiene una cuadrilla, equipo, camioneta, gente preparada las 24 horas en el temporal de lluvias, nos estamos adelantando para que este la cuadrilla lista

Mtro. Cesar Guillermo Ruvalcaba Gómez, Regidor que preside la Comisión de Hacienda Pública, ¿y ya nos cobran al final por lo que se hizo? O ¿cómo?

Ing. Juan Carlos Navarro Ruiz, Secretario Técnico de la Comisión, ya hay un catálogo Regidor, se estima cuantos jornales pudiéramos necesitar de la cuadrilla, cuantos metros, esta cuadrilla en el día la ponemos a desazolvar bocas de tormenta, canales, los desazolves son antes del temporal, una vez que quedan todos los desazolves de todos los canales se finiquitan todos los contratos, y ya nada más queda la cuadrilla de emergencias, en el día la utilizamos para limpiezas y desazolves particulares, se tiene un estimado de los metros cúbicos de desazolves de jornales de cuadrillas de día y de noche, en base a las experiencias de años anteriores más o menos podemos determinar cuántos jornales se nos van a ir de cuadrillas y conforme se va presentado el temporal de lluvias y como lo vamos trabajando le vamos solicitando más horas de cuadrilla o más metros de desazolve , dependiendo de cómo va, esto básicamente es en base a la experiencia de años anteriores que cuantificamos lo que pudiéramos más o menos necesitar.

Mtro. Cesar Guillermo Ruvalcaba Gómez, Regidor que preside la Comisión de Hacienda Pública, ¿y para que la empresa que resulte ganadora es en base a qué?

Ing. Juan Carlos Navarro Ruiz, Secretario Técnico de la Comisión, cotiza la hora de cuadrillas, jornal de cuadrilla y el metro cúbico de desazolve y quien resulte mejor es a quien se le contrata, todos obviamente cotizan lo mismo, ya a la hora de la ejecución, vamos requiriendo más de un concepto o de otro dependiendo.

Mtro. Cesar Guillermo Ruvalcaba Gómez, Regidor que preside la Comisión de Hacienda Pública, y según la zona donde se vaya requiriendo según el temporal.

El Presidente de la Comisión, Lic. Hugo de León Meza, adelante señor tesorero.

Lic. Francisco Padilla Villaruel, Tesorero Municipal, en estas obras de desazolve, recordarles que el año pasado se empezaron a hacer las obras de desazolve en particular si mal no recuerdo la de la presa el Deán, luego se vino un temporal de lluvias de 4 o 5 días.

Ing. José Luis Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas, No, antes.

Lic. Francisco Padilla Villaruel, Tesorero Municipal, y el resultado es que como la medida que se había sacado no se había llevado en definitiva al lugar donde iba a quedar, pues resulta que los primero trabajos no sirvieron para nada, porque llego el agua y se tuvo que repetir el trabajo.

Ing. José Luis Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas, por eso precisamente estamos adelantándonos.

Lic. Francisco Padilla Villaruel, Tesorero Municipal, ser cuidadosos sobre todo José Luís que la tierra que vayan sacando se vaya llevando.

Ing. José Luís Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas, lo que pasa señor tesorero, le quiero comentar que se junta el material en los vasos, se espera que pierda un poco de humedad y luego se retira y estábamos en ese proceso y se soltó el temporal, que en el 2013 fue muy errático, duro un mes más de lo que esperábamos, inclusive tenemos todavía parte a la gente que ejecuto la partida, porque estuvo alargando, termino a mediados de noviembre y una que otra lluvia en diciembre, entonces se alargo mucho el temporal de lluvias, como lo menciona el ingeniero Juan Carlos, las cuadrillas desazolvan terminan y se van , pero la gente en cuanto se retiran vuelven a echar colchones, llantas, por lo que se tiene que tener las cuadrillas listas por lo que se ofrezca.

Arq. Ricardo Flores Villaseñor, Suplente Secretaria de la Contraloría, yo con el propósito de que esto quede bien fundamentado y no tengamos problemas porque estamos fundamentando en el artículo 42 de la propia Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la mismas, en la fracción V, a reserva del último concurso que están presentando aquí, en la fracción V dice que: "*Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate, en este supuesto deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla;* " entonces en base a la fundamentación ¿cuál sería aquí el caso fortuito?

Ing. José Luís Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas, que bueno que estas tu, sugiérenos otro artículo y lo ponemos.

Arq. Ricardo Flores Villaseñor, Suplente Secretaria de la Contraloría, créanme que yo no lo digo con el afán de.

Ing. José Luís Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas, por eso, sugiérenos tu algún otro artículo que tu consideres que es mejor fundamentación y lo ponemos.

Mtro. Cesar Guillermo Ruvalcaba Gómez, Regidor que preside la Comisión de Hacienda Pública, en este caso yo creo que es mejor, perdón regidora.

Sesión Ordinaria 04/14 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública.

Dra. Maria Candelaria Ochoa Avalos, Regidora que preside la Comisión edilicia de Transparencia Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, con todo respeto creo que aquí lo que se trata es de hacer mejor las cosas.

Ing. José Luís Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas, así es, en ese sentido lo hacemos regidora.

Dra. Maria Candelaria Ochoa Avalos, Regidora que preside la Comisión edilicia de Transparencia Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, yo creo que el representante de la Contraloría no tiene la obligación de justificarlo.

Ing. José Luís Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas, no es obligación, pero.

Dra. Maria Candelaria Ochoa Avalos, Regidora que preside la Comisión edilicia de Transparencia Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, permítame por favor.

Ing. José Luís Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas, dígame.

Dra. Maria Candelaria Ochoa Avalos, Regidora que preside la Comisión edilicia de Transparencia Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, creo que el que tiene la obligación es usted y su secretario técnico, como yo alguna vez leí aquí las funciones del secretario técnico, que precisamente retomaban la intervención que hizo el regidor, y yo lo combino a que lo hagan ustedes previo a estas sesiones.

Ing. José Luís Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas, muy bien.

El Presidente de la Comisión, Lic. Hugo de León Meza, adelante señor regidor.

Mtro. Cesar Guillermo Ruvalcaba Gómez, Regidor que preside la Comisión de Hacienda Pública, en este caso si creo que es la fracción V del artículo 42, el que puede prever esto, porque efectivamente es una contingencia, que no se puede cuantificar de manera previa.

Arq. Ricardo Flores Villaseñor, Suplente Secretaria de la Contraloría, sí, yo me refiero a reserva de esta última, los anteriores que es la REMODELACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Nº 9 "PLAN DE SAN LUIS". TRABAJOS CONSISTENTES EN GIMNASIO DE BOX, MODULO DE JUEGOS Y APARATOS, REMODELACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Nº 04 "FRANCISCO JAVIER MINA". TRABAJOS CONSISTENTES EN, REMODELACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA N° 7 "HÉROES DE CHAPULTEPEC". TRABAJOS CONSISTENTES EN, quizá revisarlo.

Ing. José Luís Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas, tomaremos en cuenta observación.

El Presidente de la Comisión, Lic. Hugo de León Meza, bien, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? Entonces ponemos a su consideración la aprobación de este concurso por invitación y quienes estén a favor, les ruego lo manifiesten levantando la mano

A favor: Lic. Hugo de León Meza, Lic. Francisco Padilla Villaruel, C.P. Mario Alberto Salazar Madera Dra. Maria Candelaria Ochoa Avalos, Ing. José Luís Moreno Rojas, Ing. Alberto Arreola Castañeda, Arq. Liliana Lopez Ruelas, Ing. Rigoberto Montufar Rizo, Ing. Juan Carlos Navarro Ruiz, Ing. Héctor Manuel Zepeda Angulo, Arq. Luís Reynaldo Galván Bermejo, Arq. Juan Manuel Deseimann Arias, Ing. Luís Rubén Camberos Othon

Abstención: Mtro. Cesar Guillermo Ruvalcaba Gómez, Arq. Ricardo Flores Villaseñor

Aprobado, bien siguiente punto es señor secretario es obras para Licitación Pública.

Ing. José Luís Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas, para Licitación Pública señor presidente y miembros de esta comisión tenemos

Número de contrato: **OPG-CZM-PAV-LP-C04-034/14**

Obra: PRIMERA ETAPA DE RENOVACIÓN DEL PARQUE REVOLUCIÓN

Sesión Ordinaria 04/14 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública.
Ubicación: CALZADA DEL FEDERALISMO NORTE, ENTRE LÓPEZ COTILLA Y PEDRO MORENO, COL. AMERICANA, DE LA ZONA 1 CENTRO

Duración: 150 días, **Anticipo:** 30%

Es un proyecto de la Comisión de Planeación Urbana y es la calle.

Ing. Alberto Arreola Castañeda, Suplente Secretario de Servicios Públicos Municipales, Marcos Castellanos

Ing. José Luís Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas, Marcos Castellanos

Ing. Alberto Arreola Castañeda, Suplente Secretario de Servicios Públicos Municipales, Marcos Castellanos, Avenida Vallarta y Federalismo.

Ing. José Luís Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas, todo el cuadrante.

Número de contrato: **OPG-CZM-PAV-LP-C04-035/14**

Obra: PRIMERA ETAPA DE RENOVACIÓN URBANA DEL CANAL DEL SUR

Ubicación: LUIS COVARRUBIAS, ENTRE AV. 8 DE JULIO Y 03 DE MAYO, ZONA 7 CRUZ DEL SUR

Duración: 150 días, **Anticipo:** 30%

Es un proyecto grande, por lo que este año se asigna una cantidad, con determinados conceptos para poder licitar y ver que empresa nos realiza la mejor oferta y de esta manera ejercer el recurso 2014, esta es la primer etapa por lo que en el 2015 se esperan más recursos.

Número de contrato: **OPG-CZM-PAV-LP-C04-036/14**

Obra: PRIMERA ETAPA DE RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE ANALCO

Ubicación: COMPRENDIDO EN EL POLÍGONO ENTRE LA AVENIDA REVOLUCIÓN Y LAS CALLES NICOLÁS BRAVO, BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y 20 DE NOVIEMBRE, DE LA ZONA 1 CENTRO

Duración: 150 días, **Anticipo:** 30%

Se tiene que llevar a cabo por medio de licitación pública debido al monto del presupuesto base, para las 3 obras se cuenta con un presupuesto de $43'000,000.00 de pesos.

El Presidente de la Comisión, Lic. Hugo de León Meza, $43'000,000.00 para realizar estas obras.

Dra. Maria Candelaria Ochoa Avalos, Regidora que preside la Comisión edilicia de Transparencia Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, sí, a mí aquí me gustaría saber en concreto que tipo de obra se van a realizar, el catálogo de obra para tenerlo previamente, y saber que lo se va a hacer.

Ing. José Luís Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas, se lo hacemos llegar con mucho gusto, el catálogo de las 3 obras.

Arq. Liliana López Ruelas, Suplente Titular de la Comisión de Planeación Urbana de Guadalajara, en respecto a eso la Comisión de Planeación Urbana, sugiere, es algo bajo reserva de ustedes que en el tema de la obra del parque Revolución, se contemple dentro de las bases de licitación a una empresa constructora que cuente en su planilla con un especialista de restauración, en el entendido que es un espacio relevante, por otra parte una de las empresas que nosotros estamos considerando es la que realizo el proyecto ejecutivo es el arquitecto Juan Pedro Palomar se pudiera ver la factibilidad de que el fuera el supervisor de obra y que igual hiciera las gestiones ante el INAH, conociendo que el tema que se quiere rescatar aquí principalmente en el parque son esos elementos que en su momento le dieron viabilidad y que posteriormente después se declare

como un elemento artístico, entonces si nos gustaría que se contemplará esa posibilidad en el tema de las bases de la licitación.

Dra. Maria Candelaria Ochoa Avalos, Regidora que preside la Comisión edilicia de Transparencia Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, haber lo que pasa es que estamos haciendo una licitación pública, entonces si vamos a hacer una licitación pública estamos en ese proceso, entonces yo culminaría que se hace la licitación pública y tomamos una decisión o en todo caso que la COPLAUR proponga de antemano una designación, pero no podemos estar discutiendo las 2 cosas al mismo tiempo, porque son 2 procesos legales distintos.

Arq. Juan Manuel Deseimann Arias, Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, aprovechando nos podrías presentar las bases de licitación que vas solicitar para cada proceso.

Ing. José Luís Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas, van a salir publicadas, a partir de mañana, yo creo que ya están disponibles en Internet para todo el mundo.

El Presidente de la Comisión, Lic. Hugo de León Meza, adelante señor regidor.

Mtro. Cesar Guillermo Ruvalcaba Gómez, Regidor que preside la Comisión de Hacienda Pública, bueno en el sentido de lo que se comentaba este es el primer momento donde se abre la licitación y luego tendríamos otra reunión ya concluido los que participaron en ella, evidentemente rescato la fundamentación de COPLAUR, que el momento en el que se tenga que hacer la evaluación se tenga en consideración este tipo de elementos, puesto que base en lo que había dicho al principio es fundamental que las empresas y constructoras que estén trabajando en unidades deportivas, sean expertas en unidades deportivas, o tengan un vínculo con unidades deportivas, en materia de parque, de la misma manera en desarrollos urbanos, que digamos tengan características y un currículum que los avale, porque luego tu te das cuenta que hay empresas que no tienen experiencia en determinados segmentos, en este caso por lo delicado de la obra ya es un parque emblemático de la ciudad, que tiene obras protegidas por el INAH y que también se debe tomar en consideración, pero además de solicitarle el catálogo de obra, las bases de licitación, que nos puedan hacer llegar, en el caso del canal del sur, yo conozco un proyecto de COPLAUR al respecto, un proyecto conceptual hasta donde yo lo vi, no lo vi de manera ejecutiva, de todo lo que se va a hacer, que me parece maravilloso, además de el proyecto, lo que yo quisiera preguntar es que ¿con los $43'000,000.00 que alcance tendria para este proyecto? Si en las bases de licitación viene considerado culminarlo o es una primera etapa de intervención en este canal.

Ing. José Luís Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas, es la primera etapa regidor, son los recursos que se consiguieron en el 2014 y es la primera etapa de la obra

Mtro. Cesar Guillermo Ruvalcaba Gómez, Regidor que preside la Comisión de Hacienda Pública, del proyecto ejecutivo, perdón, del proyecto conceptual que tiene COPLAUR de intervención al canal ¿qué es lo que se va a ejecutar no se cubre ese proyecto en su totalidad?

Ing. José Luís Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas, no, es un proyecto costoso que no hay recursos para hacerlo en un solo año, se hace una primera inversión y en el segundo año seguiremos trabajando depende de los recursos que se consigan

El Presidente de la Comisión, Lic. Hugo de León Meza, adelante

Ing. Rigoberto Montufar Rizo, Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales, Señor secretario yo nada más quiero hacerle una pregunta ¿la rehabilitación del parque rojo que se tiene considerado un meter concreto en Pedro Moreno, López Cotilla, Marcos Castellano y la rehabilitación dentro del parque, dice que tiene $43'000,000.00 de pesos para las 3 obras.

Ing. José Luís Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas, así es.

Ing. Rigoberto Montufar Rizo, Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales, Realmente ¿ya consideraron el costo real de lo que es el concreto hidráulico que le van a meter? porque se nos puede disparar

Ing. José Luís Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas, aquí quiero.

Ing. Rigoberto Montufar Rizo, Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales, Eso es lo que no quiero que al rato se nos disparara la obra.

Ing. José Luís Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas, sobre todo aquí en el parque

Ing. Rigoberto Montufar Rizo, Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales, en el parque rojo, es a lo que le tengo miedo.

Ing. José Luís Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas, tengo entendido que no distribuyo exactamente los catálogos, tengo entendido que lo que se va a intervenir es prácticamente el área de la calle de Marcos Castellanos.

Ing. Rigoberto Montufar Rizo, Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales, un proyecto que traían era meter el concreto hidráulico en las 3 calles, Marcos Castellanos, Pedro Moreno y López Cotilla.

Ing. José Luís Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas, tengo entendido que únicamente el recurso que tenemos es para Marcos Castellanos.

El Presidente de la Comisión, Lic. Hugo de León Meza, adelante

Arq. Úrsula Irene Barreda Zamora, Representante de la Comisión de Planeación Urbana de Guadalajara, El proyecto que se les presento a varios secretarios en presidencia, se tuvo que plantear de qué manera se podía desarrollar estratégicamente en etapas, porque en general el proyecto para lograr una rehabilitación integral de toda la zona, la etapa de pavimentaciones y banquetas de todas las vialidades que están a su alrededor, partiendo de esto y del recurso que ahorita se tiene aproximadamente, no sé si pueda mencionar por ser un caso de una, bueno, del recurso que se tenía contemplado del fondo metropolitano 2013, que es el que se está asignado ahorita , es un recurso menor al que se le asigno en el 2014, entonces en esta etapa lo que vio con los arquitectos que va hacer todo el cuartelon del lado sur, de manera integral sin integrar la calle de López Cotilla, pero si la de Marcos Castellanos, y posteriormente el recurso que viene etiquetado en el fondo metropolitano etiquetado 2014, alcanzará para la nivelación Juárez el cuartelon del lado norte y todas las calles del entorno, pero en este momento sólo se alcanzaría a rehabilitar la mitad del pasto, con esta asignación.

Ing. Rigoberto Montufar Rizo, Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales, ¿Pero tienen considerado 16,000 metros cuadrados de concreto?

Arq. Úrsula Comisión de Planeación Urbana de Guadalajara, en este momento no.

Dra. Maria Candelaria Ochoa Avalos, Regidora que preside la Comisión edilicia de Transparencia Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, yo le pediría a COPLAUR si nos puede hacer llegar una copia del proyecto también para conocerlo.

Úrsula Irene Barreda Zamora, Representante de la Comisión de Planeación Urbana de Guadalajara, claro.

Dra. Maria Candelaria Ochoa Avalos, Regidora que preside la Comisión edilicia de Transparencia Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, a los miembros de esta comisión.

El Presidente de la Comisión, Lic. Hugo de León Meza, bien en ese sentido pongo a su consideración la aprobación de esta licitación y quienes estén a favor les ruego lo levantando la mano.

A favor: Lic. Hugo de León Meza, Lic. Francisco Padilla Villaruel, C.P. Mario Alberto Salazar Madera Dra. Maria Candelaria Ochoa Avalos, Ing. José Luís Moreno Rojas, Ing. Alberto Arreola Castañeda, Arq. Liliana Lopez Ruelas, Ing. Rigoberto Montufar Rizo, Ing. Juan Carlos Navarro Ruiz, Ing. Hector Manuel Zepeda Angulo, Arq. Luís Reynaldo Galván Bermejo, Arq. Juan Manuel Deseimann Arias, Ing. Luís Rubén Camberos Othon.

Aprobado, ¿Quiénes estén por la abstención?

Abstención: Mtro. Cesar Guillermo Ruvalcaba Gómez, Arq. Ricardo Flores Villaseñor

Pasaríamos al punto número 7 Asuntos Varios, adelante ingeniero.

Sesión Ordinaria 04/14 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública.

Ing. Alberto Arreola Castañeda, Suplente Secretario de Servicios Públicos Municipales, quiero poner aquí en la comisión el tema de la Plaza Guadalajara, específicamente de su fuente, el pasado 14 de febrero se puso por ahí una filtración fuera de lo normal en lo que son las partes comerciales en sótanos de la propia plaza, hemos estado revisando la fuente, que es el punto importante en el que me quiero enfocar ahorita y hace 60 años se inauguró esa fuente, hace 60 años que no se ha tocado el tema de la impermeabilización, de la edificación que tiene, la fuente es parte simbólica del centro de Guadalajara, lo que quiero dejar asentado en esta comisión es que se planteé la intervención, de la fuente principalmente, pero atendiendo a la plaza en su totalidad, no solo la fuente tiene filtraciones, las propias jardineras tienen filtraciones en los diferentes puntos que están instaladas, lo que nos han comentado los comerciantes , en su momento cuando se inauguró esa plaza comercialmente fue un éxito, ¿porqué se dejo caer? No sé, pero si vale la pena hacer una intervención ahí, se decía que iba a ser una terminal, hemos estado preguntando, la Plaza Guadalajara no va a ser terminal de la línea 3 del tren ligero y para Guadalajara como municipio, su parte central independientemente de los poderes que existan ahí, es la Plaza Guadalajara, es la parte frontal de Palacio Municipal, que está frente a la catedral, que están los arcos, es emblemática la Plaza Guadalajara, yo si quiero poner en la mesa para que se analizará para poder intervenirla, porque todos planteamos en la necesidad de ponerla a funcionar en estos días, ahora que tenemos turismo, que tenemos visitantes, pero luego entonces podemos recurrir a lo que paso el 14 de febrero que iba a ser conflictivo y lo que hemos venido planteando es la intervención integral, no solo de la fuente, sino de todo lo viene siendo la plaza, por todo lo que esto representa y lo que les acabo de mencionar, lo dejo a consideración de ustedes y me gustaría que se tomará para su análisis.

El Presidente de la Comisión, Lic. Hugo de León Meza, adelante regidora.

Dra. Maria Candelaria Ochoa Avalos, Regidora que preside la Comisión edilicia de Transparencia Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, que bueno que la parte ejecutiva de este ayuntamiento está poniendo la atención en eso, nosotros lo hemos solicitado hace tiempo, a solicitud de los comerciantes y por cierto que la oficina ahí de Tesorería, la chica que trabaja ahí tiene un conjunto de enfermedades por la humedad y los olores que está recibiendo ahí, nos va a demandar al rato, porque tiene un problema de pulmones muy serio, entonces qué bueno que se toma esa decisión, yo creo que independientemente de que sean las vacaciones, me parece que poner en funcionamiento en estas vacaciones esa fuente, sería un peligro para las personas que transitan ahí , pero sobre todo para la gente que está abajo, entonces yo estoy de acuerdo, que bueno que se va a intervenir.

El Presidente de la Comisión, Lic. Hugo de León Meza, adelante secretario.

Ing. José Luís Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas, ya tenemos nosotros el estudio para reparar la fuente y nos arroja un presupuesto de $2'600,000.00 pesos y se requieren 14 semanas, solicito me autoricen a contratarlo y lo hacemos de inmediato.

Ing. Alberto Arreola Castañeda, Suplente Secretario de Servicios Públicos Municipales, que no quedará solo en la fuente.

Dra. Maria Candelaria Ochoa Avalos, Regidora que preside la Comisión edilicia de Transparencia Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, y las jardineras.

Ing. Alberto Arreola Castañeda, Suplente Secretario de Servicios Públicos Municipales, la plaza en su totalidad.

Ing. José Luís Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas, yo creo que con esa asignación pudiéramos reparar inclusive las jardineras, es mínimo,

Dra. Maria Candelaria Ochoa Avalos, Regidora que preside la Comisión edilicia de Transparencia Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, yo propongo que se haga una propuesta conjunta y que nos la presenten, y yo estoy a favor de que se haga.

C.P. Mario Alberto Salazar Madera, Suplente Regidor que Preside la Comisión de Obra Pública, ya presento incluso el secretario de promoción económica a petición de Obras Públicas, varios proyectos, incluso

marcaba un proyecto mínimo, básico de intervención a la Plaza Guadalajara y otro más ambicioso, valdría la pena que plantearán aquí en esta mesa.

El Presidente de la Comisión, Lic. Hugo de León Meza, adelante ingeniero.

Ing. Rigoberto Montufar Rizo, Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales, nada más para hacerles entrega del presupuesto de la obra de Juan Pablo II, rescatar la vialidad de Juan Pablo II, yo me comprometí con todos ustedes de darles una copia del presupuesto.

El Presidente de la Comisión, Lic. Hugo de León Meza, en cuanto al tema de la Plaza Guadalajara, señor secretario a propuesta del regidor si sería importante que empatáramos los proyectos que tiene promoción económica, para analizarlo por áreas técnicas de Obras Públicas, para determinar cual es el más adecuado.

Ing. José Luís Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas, independientemente del destino de área comercial tenemos que intervenir, impermeabilizar para que no haya filtraciones hacia abajo.

El Presidente de la Comisión, Lic. Hugo de León Meza, y sobre todo revisar que no haya filtraciones en las jardineras, incluye también la reparación de las mismas. Adelante señor regidor.

Mtro. Cesar Guillermo Ruvalcaba Gómez, Regidor que preside la Comisión de Hacienda Pública, si, los proyectos que comentaba el regidor Salazar, que a presentado Promoción económica son de carácter conceptual, no son proyectos de que se tendría que hacer, ahora hay que pasarlo de lo económico al área de Obras Públicas.

El Presidente de la Comisión, Lic. Hugo de León Meza, muy bien

C.P. Mario Alberto Salazar Madera, Suplente Regidor que Preside la Comisión de Obra Pública, ¿los recursos de donde vienen?

Ing. José Luís Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas, son recursos municipales, hay un techo financiero.

Lic. Francisco Padilla Villaruel, Tesorero Municipal, todo lo que sea recursos municipales, ya hay un programa de obras, hay presupuestos, y si le estamos agregando cosas, falta que haya recursos, primero vamos viendo cuales obras se sustituyen, para que no vayamos a tener problemas con los anticipos.

Ing. José Luís Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas, quiero mencionar que todas las obras que hacemos, antes de arrancar tenemos las partidas presupuestales, y tenemos una excelente coordinación con la oficina que tesorería tiene aquí, que es representada por la Sra. Ana Cruz, en este caso estamos asignando y adelantándonos, no se arranca ninguna obra hasta que no tenemos partida presupuestal, sólo esta vez estamos adelantándonos a que nos den la partida y nos esperemos a que vuelva a ver comisión adjudicación, esto nos representa al menos un mes, pero no se arranca ninguna obra en tanto no se tenga la partida presupuestal.

Ing. Alberto Arreola Castañeda, Suplente Secretario de Servicios Públicos Municipales, precisamente la oportunidad que se da en la Secretaría de Servicios Públicos Municipales de poner esto en la mesa, es porque en el mantenimiento propio que la secretaria tiene para poder abastecer el buen estado de la plaza, está fuera de nuestras manos, entonces por eso ponemos eso aquí porque ya esta otra en espera y si pedimos que se busque las oportunidades económicas que nos permitan recuperar un espacio propio de Guadalajara.

El Presidente de la Comisión, Lic. Hugo de León Meza, entonces ¿este proyecto incluye también las jardineras? Señor secretario.

Ing. José Luís Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas, sí, las repararíamos en lo mismo, porque es mínimo el costo de las jardineras.

El Presidente de la Comisión, Lic. Hugo de León Meza, bien entonces ponemos a su consideración de que pudiéramos aprobar esta emergencia que se tiene en la Plaza Guadalajara, y les ruego lo aprobemos, los que estén de acuerdo lo manifiesten levantando la mano

Lic. Francisco Padilla Villaruel, Tesorero Municipal, nada más para que quede claro ¿los trabajos que se van a hacer son de impermeabilización?

Ing. José Luís Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas, impermeabilización de la fuente, sí, para que después no tengamos problemas de filtraciones, si tenemos que cambiar tubería, se hará, consideramos que con $2'600,000.00 es lo que nos costaría.

El Presidente de la Comisión, Lic. Hugo de León Meza, bien entonces reitero, los que estén a favor lo manifiesten levantando la mano

A favor: Lic. Hugo de León Meza, Lic. Francisco Padilla Villaruel, C.P. Mario Alberto Salazar Madera Dra. Maria Candelaria Ochoa Avalos, Ing. José Luís Moreno Rojas, Ing. Alberto Arreola Castañeda, Arq. Liliana Lopez Ruelas, Ing. Rigoberto Montufar Rizo, Ing. Juan Carlos Navarro Ruiz, Ing. Héctor Manuel Zepeda Angulo, Arq. Luís Reynaldo Galván Bermejo, Arq. Juan Manuel Deseimann Arias, Ing. Luís Rubén Camberos Othon.

Aprobado, ¿Quiénes estén por la abstención?

Abstención: Mtro. Cesar Guillermo Ruvalcaba Gómez, Arq. Ricardo Flores Villaseñor

Dra. Maria Candelaria Ochoa Avalos, Regidora que preside la Comisión edilicia de Transparencia Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, yo quiero hacer unos comentarios.

El Presidente de la Comisión, Lic. Hugo de León Meza, adelante regidora.

Dra. Maria Candelaria Ochoa Avalos, Regidora que preside la Comisión edilicia de Transparencia Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, tengo 3, bueno 4 en realidad, lo primero es una nota que salió hoy en metrópolis de lo mal hecho de las esquinas del cruce de av. Federalismo y La Paz le quisiera leer la nota que es pequeña, unos cuantos renglones, dice "*De vergüenza ajena la mano de obra con la que se llevan a cabo los trabajos del Ayuntamiento de Guadalajara, en las esquinas del cruce de avenida Federalismo y avenida La Paz. De entrada, la obra presenta jorobas y desniveles, lo que hace suponer la mala instalación del terraplén. El adoquín está separado y mal nivelado, incluso con el riesgo de que con arrancarse uno, los demás adoquines se sigan desprendiendo. Además se nota la mala compactación de la arena o el mal trabajo de la maquina conocida como "bailarina", pues en algunos tramos hay bolas o grumos en el cemento. Así de mal hechotas están las esquinas del cruce de avenida Federalismo y avenida La Paz, una obra del Ayuntamiento de Guadalajara, y no se necesita ser ingeniero para verlo cualquier ciudadano se puede dar cuenta de tales desperfectos*" Por José Luís Jiménez Castro.

Entonces secretario le pediría también como miembro de esta comisión que revisarán estas irregularidades, y hay otras más, me llamo una vecina, que su hermano tiene un gimnasio en el camellón de Gobernador Curiel, en particular en el 3370 y que en frente de ahí plantaron árboles el Ayuntamiento de Guadalajara, que no solo los dejaron ahí abandonados, si no que hoy prácticamente están secos y que su hermano se a dedicado a regarlos y que ahora la cuenta del agua esta altísima, entonces le pediría que por su conducto sea atendido este caso, que plantaron los árboles y que luego no sirven, porque los abandonamos, y el otro es un oficio de los vecinos de providencia de un conjunto que le hicieron llegar, un conjunto de irregularidades por los cambios de usos de suelo, que supongo que tengan copia, pero si no, yo se la hago llegar.

Ing. José Luís Moreno Rojas, Secretario de Obras Públicas, sí, le agradezco que me la haga llegar.

El Presidente de la Comisión, Lic. Hugo de León Meza, nada más agradecerles su presencia. Gracias.

Leída la presente acta de la sesión Ordinaria 04/14 y enterados de su contenido y alcance legales, la firman y ratifican los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad con los artículos 19 numeral I fracción III y 21 numeral 1 fracción III, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, Jalisco. Hoy 11 de abril de 2014, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Sesión Ordinaria 04/14 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública.

Ing. Ramiro Hernández García
Presidente Municipal

Lic. Hugo de León Meza
Presidente de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública

Lic. Francisco Javier Padilla Villarruel
Tesorero Municipal

Suplente: L.A.E María del Rosario Ruiz Uribe

C.P.A. Gustavo César Galindo
Secretario de la Contraloría

Suplente: Arq. Ricardo Flores Villaseñor

Lic. Alejandro Raúl Elizondo Gómez
Regidor que Preside la Comisión de Obra Pública

Suplente: C.P. Mario Alberto Salazar Madera

Lic. José Luís Ayala Cornejo
Regidor que preside la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable

Suplente:

Mtro. Carlos Alberto Briseño Becerra
Regidor que preside la Comisión de Hacienda Pública

Suplente: Mtro. Cesar Guillermo Ruvalcaba Gómez

Dra. María Candelaria Ochoa Ávalos
Regidora que preside la Comisión edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción

Suplente:

Ing. Jose Luis Moreno Rojas
Secretario de Obras Públicas

Suplente: Ing. Juan Carlos Navarro Ruiz

Lic. José Francisco Castillo Madrigal
Secretario de Servicios Públicos Municipales

Suplente: Ing. Alberto Arreola Castañeda

Arq. Diego Delfín Álvarez del Castillo
Titular de la Comisión de Planeación Urbana de Guadalajara

Suplente: Arq. Sergio Humberto Baeza Camacho.

Ing. Rigoberto Montufar Rizo
Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales

Suplente: Lic. Jaime Fajardo Vázquez

Ing. Juan Carlos Navarro Ruiz
Secretario Técnico de la Comisión

Suplente: Arq. Luis Fernando de Alba Perez.

Ing. Benjamín Cardenaz Chávez
Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Suplente: Ing. Javier Chacón Benavides

Ing. Alejandro Guevara Castellanos
Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C

Suplente: Ing. Hector Manuel Zepeda Angulo

Arq. Luis Reynaldo Galvan Bermejo
Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C

Suplente: Arq. Fausto Rangel Ramírez

Ing. Luís Rubén Camberos Othón
Consejero para la Transparencia y la Ética Pública

Suplente: Lic. Rafael Preciado Vargas
